

Certificação PMI-ACP

Riscos, Aquisições e Integração no Ágil

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Projetos Ágeis

- [Apresentação](#) 3
- [Riscos](#) 9
- [Aquisições](#) 14
- [Integração](#) 20

Aula 2: Gerenciamento de Riscos

- [Riscos no Ágil](#) 25
- [Registro de Riscos](#) 32
- [Resposta aos Riscos](#) 38

Aula 3: Gerenciamento de Aquisições

- [Contratações Ágeis](#) 55
- [A questão do Faturamento](#) 61
- [Relacionamento com fornecedores](#) 70

Aula 4: Gerenciamento de Integração no Ágil

- [Planejamento](#) 75
- [Monitoração e Controle](#) 84
- [Gerenciamento de mudanças](#) 90

Aula 5: Riscos, Aquisições e Integração

- [Discussões Práticas](#) 95
- [Conclusões](#) 100

Aula 1: Projetos Ágeis

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Desenvolvedores(as) com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o sexto curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação PMI-ACP ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner").
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o Ágil!

O que será tratado neste curso

- Conceitos básicos sobre Riscos, Aquisições e Integração.
- Gerenciamento de Riscos no Ágil.
- Gerenciamento de Aquisições no Ágil.
- Gerenciamento da Integração no Ágil.
- Discussões práticas e conclusões.

Benefícios para quem participa:


- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Aula 1: Projetos Ágeis

Riscos

Riscos - conceitos

- **Risco** = evento incerto, que se ocorrer pode trazer impactos positivos ou negativos no projeto.

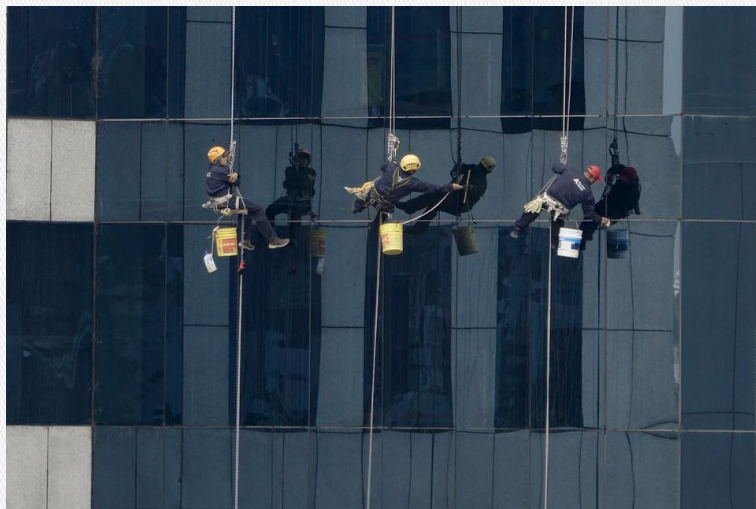


Riscos - conceitos

- Risco “bom” = oportunidade.
- Principais **fatores** de um risco:
 - Probabilidade
 - Impacto
- **Nível** ou **Grau** do risco = Probabilidade X Impacto.

Como descobrir os riscos?

- Pergunte à equipe!
- Todos devem ser estimulados a sinalizar **candidatos a risco**.
- A questão é “parece haver alguma armadilha ou ameaça no nosso caminho?”



O que fazer com os riscos descobertos?



Aula 1: Projetos Ágeis

Aquisições

Aquisições (*Procurement*)

- A contratação de um projeto de software a escopo, preço e prazo fixos baseado na abordagem **waterfall** é contrária ao Ágil.



Aquisições (*Procurement*)

- Por outro lado, existiu durante muito tempo na indústria do software uma cultura de “quero saber quanto vai custar e o que eu vou receber” a priori.
- A forma tradicional de **orçamentação** contribuiu para este modelo.



Aquisições (*Procurement*) no Ágil

- Com a difusão do Ágil, teve um início um balanceamento de compromissos e expectativas, ainda em curso, desfazendo aos poucos o waterfall no software.
- Além disto, o software feito por encomenda tornou-se menos comum — hoje há muitos **pacotes** e **soluções SaaS** (Software as a Service).

Aquisições (*Procurement*) no Ágil

- Este movimento de expansão do Ágil, que interfere diretamente na forma de comprar software, está envolvendo:
 - Mais foco em **valor** do que em **preço**.
 - Horizontes mais curtos de venda e compra.
 - Compreensão de que o escopo do software não é definido, mas sim vai sendo descoberto e isto não precisa ser um problema.

Aquisições (*Procurement*) no Ágil


- Este movimento de expansão do Ágil, que interfere diretamente na forma de comprar software, está envolvendo:
 - Mudança de mentalidade rumo à **confiança**.
 - Visão mais de **fluxo** (cadeia de valor) e menos de projetos (silos, produtos entregues em grandes lotes).

Aula 1: Projetos Ágeis

Integração


Integração

- Nos projetos de software, a palavra **integração** tem dois significados distintos:
 - Fechar uma versão operacional do produto (**integração do software**).
 - Amarrar os diversos processos que compõem a gestão de projetos rumo a um método que funcione (**integração da gestão de projetos**).



Integração de gestão de projetos

- Esta integração é feita, principalmente, nas atividades de:
 - Planejamento
 - Monitoração e Controle

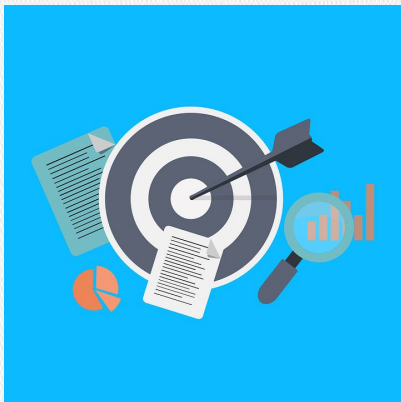

Integração de gestão de projetos

- Por exemplo, em tempo de **planejamento**, estamos integrando (“costurando”) processos ligados a:
 - Escopo
 - Tempo
 - Riscos
 - Qualidade
 - Comunicação
 - Recursos Humanos / Stakeholders
 - Etc.

Integração de gestão de projetos no Ágil


- Os **métodos ágeis** possuem rituais de planejamento e monitoração e controle.
- As formas como eles ocorrem, todavia, são distintas do que se passa no ciclo waterfall.
- Ou seja, no Ágil a integração de gestão de projetos possui particularidades.

Aula 2: Gerenciamento de Riscos

Riscos no Ágil

Os riscos do projeto no contexto do Ágil


- Além de lidar de forma mais racional com o escopo do produto complexo, o Ágil contribui para a **pulverização dos riscos**.

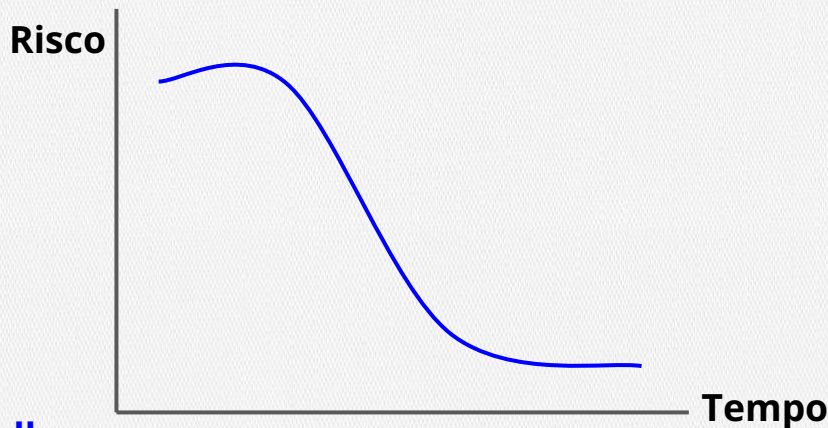

Waterfall

- ❑ Início de (único) ciclo de produção com risco elevado.
- ❑ Poucos (ou único) “momentos da verdade”.

Os riscos do projeto no contexto do Ágil




Ágil (iterativo e incremental)

- ❑ Início de (cada) ciclo de produção com risco menor, pela pulverização.
- ❑ Vários “momentos da verdade”.
- ❑ Versões de produto entregues com frequência => menor “ansiedade” e menores riscos de integração e conformidade.

Quem lida com os riscos no Ágil?

- Scrum Master pode e deve executar processos de **gestão de riscos** para lidar com **impedimentos potenciais**.
- Com isto, Scrum Master não age só reagindo, mas sim procura se antecipar aos problemas e desta forma proteger melhor a equipe.
- É muito importante envolver o Product Owner na gestão de riscos.

Risk Burndown Chart

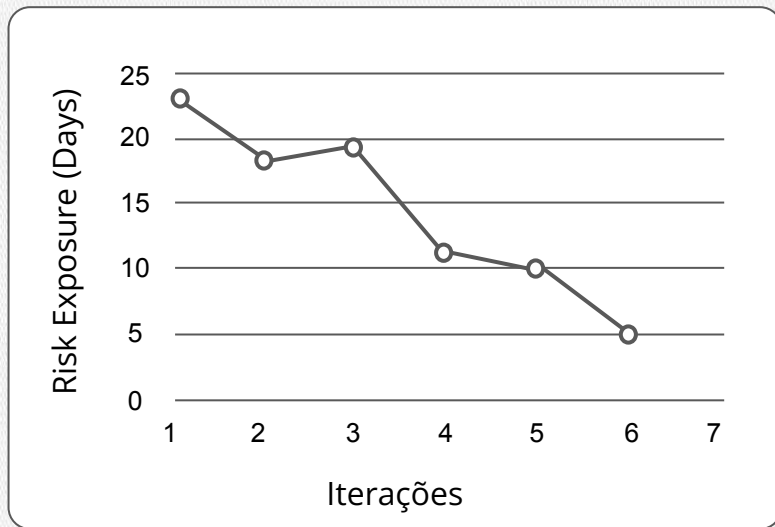

Risk Exposure (Days) = $\sum$ Probabilidades x Impactos em dias de todos os riscos do projeto

Spike

- É um período (*timeboxed*) designado para **redução de incerteza** por meio do **aprendizado** de uma funcionalidade, tecnologia ou processo para estimar melhor e desenvolver / consertar uma parte do produto com mais segurança.



Spike

- Um spike pode resultar em uma decisão, um protótipo, uma **POC (Proof Of Concept)** ou alguma outra solução parcial que ajude no atingimento de resultados finais.



Aula 2: Gerenciamento de Riscos

Registro de Riscos

Enunciado de um risco

- Uma fórmula de enunciado de um risco:

< efeito > devido a < causa >

- Exemplos:
 - **Atraso na obra devido a falta de material.**
 - **Explosão devida a vapores inflamáveis confinados.**
 - **Retrabalhos devido a definições de requisitos pouco conversadas.**

Padronização de probabilidades e impactos

- **Probabilidade**


- **Remota** – em torno de 10% ou menos de chance de ocorrer ($P = 0,10$)
- **Menos provável** – em torno de 25% de chance de ocorrer ($P = 0,25$)
- **Provável** – em torno de 50% de chance de ocorrer ($P = 0,50$)
- **Muito provável** – em torno de 70% de chance de ocorrer ($P = 0,70$)
- **Quase certo** – em torno de 90% ou mais de chance de ocorrer ($P = 0,90$)

Padronização de probabilidades e impactos

- **Impacto**
 - **Baixo** – consequências de atrasos e/ou impactos financeiros sem muita importância ($I = 1$)
 - **Médio** – consequências de atrasos e/ou impactos financeiros relevantes ($I = 2$)
 - **Alto** - consequências de atrasos e/ou impactos financeiros muito sérios ($I = 3$)

Níveis padronizados decorrentes

Análise qualitativa do risco		
Probabilidade	Impacto	Nível
90%	3	2,7
70%	3	2,1
90%	2	1,8
50%	3	1,5
70%	2	1,4
50%	2	1,0
90%	1	0,9
25%	3	0,8
70%	1	0,7
25%	2	0,5
50%	1	0,5
10%	3	0,3
25%	1	0,3
10%	2	0,2
10%	1	0,1



Riscos que mais
merecem atenção



Riscos que
merecem pouca
atenção

Registro de Riscos - iniciando o preenchimento

		Análise Qualitativa			
ID do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Dono
01	Incêndio devido a curto-circuito	Baixa	Alto	Médio	José

Aula 2: Gerenciamento de Riscos

Resposta aos Riscos

Resposta aos Riscos

- Trata-se de um conjunto de ações que visam lidar com os riscos identificados.



Estratégias de Resposta aos Riscos

- **Evitar (“Avoid”)** = eliminar a causa da ameaça, removendo o risco.



- Para oportunidades : “Exploit”

Estratégias de Resposta aos Riscos

- **Minimizar (“Mitigate”)** = reduzir a probabilidade e/ou o impacto do risco.



- Para oportunidades : “Enhance”

Estratégias de Resposta aos Riscos

- **Transferir (“*Transfer*”)** = transferir o risco, em todo ou em parte, para terceiros.



- Para oportunidades : “*Share*”

Estratégias de Resposta aos Riscos

- **Aceitar ("Accept")** = decidir conviver com risco sem nada fazer (**pode exigir planos de contingência**).



- Para oportunidades : "Accept"

Plano de mitigação

- São ações que visam **reduzir a probabilidade e/ou o impacto do risco**.




Plano de contingência

- São ações que devem ser tomadas caso o risco se realize.



Plano de fallback

- São ações que devem ser tomadas caso o plano de contingência falhe.

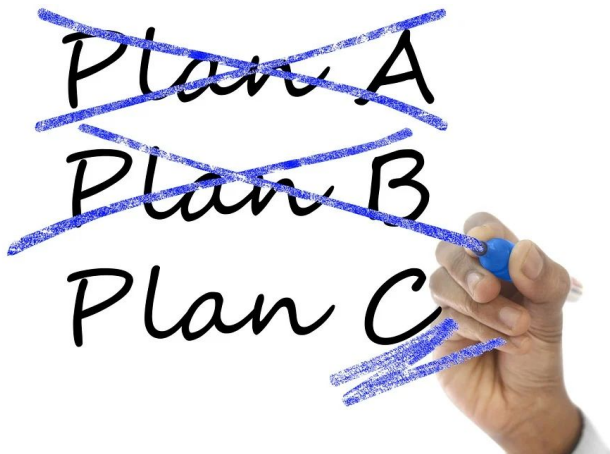

Completando o Registro de Riscos

Plano de Resposta		Status
Mitigação	Contingência	
Rever fiação	Acionar bombeiros	Ativo
Utilizar disjuntores		

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Não satisfação das expectativas dos clientes.
- **Ação de mitigação:** Permitir ao cliente ver o produto em desenvolvimento continuamente, nas Reviews.

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Não atendimento do escopo.
- **Ação de mitigação:** Priorização do desenvolvimento, ao longo das iterações.

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Estimativas e planejamentos incompletos.
- **Ação de mitigação:** Adoção de reuniões diárias e estimativas / planejamentos para horizontes curtos de desenvolvimento (iterações).

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Não resolução de problemas prontamente.
- **Ação de mitigação:** Demanda diária de ações da gestão (nas reuniões diárias).

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Não entrega do produto e perda do investimento.
- **Ação de mitigação:** Liberação de software funcionando a cada iteração.

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Turbulências na entrega do produto.
- **Ação de mitigação:** As entregas incrementais forçam a equipe a enfrentar problemas de entrega cedo, “azeitando” os processos inerentes (*Configuration Management, Release Management, Testes de Regressão*).

Riscos típicos de desenvolvimento de software e mitigações trazidas pelo Ágil

- **Risco:** Mudanças de expectativas / mudanças excessivas.
- **Ação de mitigação:** Trabalho com metas / backlogs de iterações congelados — sempre há oportunidade de desenvolver o que ficou de fora na próxima Iteração, procurando trazer o máximo valor mais cedo.

Aula 3: Gerenciamento de Aquisições

Contratações ágeis

Contratações ágeis

- A forma mais simples de contratar projetos ágeis é manter uma equipe de desenvolvimento com determinado tamanho para construir a solução pelo tempo que for necessário.
- Esta equipe envolveria uma **despesa fixa** da empresa, como se fosse um setor administrativo, mas atuando como um **centro de resultado**.

Contratações ágeis

- Contudo, existe uma cultura arraigada de que “projetos não podem ser desenvolvidos sem um budget” ou “não podem consumir recursos indefinidamente”.
- Este pensamento tem origem na **projetização do desenvolvimento de software**.

Contratações ágeis

- No modo de pensar projetizado, o desenvolvimento de software é visto como algo que tem “começo, meio e fim”. Ao “término” do desenvolvimento, deve cessar o investimento.



Contratações ágeis

- Todavia, um software na verdade nunca está terminado ao longo de sua vida útil.
- Isto não significa “projeto sem data para terminar”. Na verdade, trata-se de um investimento que vai dando retorno na medida em que valor é adicionado ao negócio.

Contratações ágeis

- Na impossibilidade de encarar TI como um centro de resultado, existem algumas formas menos nocivas de lidar com a questão financeira.



Aula 3: Gerenciamento de Aquisições

A questão do faturamento

Faturamento X entregas

- A aquisição de software como se fosse uma obra, um utensílio ou uma edificação gera o pensamento “vou pagar X e quero portanto saber o quê e quando vou receber”.



Faturamento X entregas

- Então, surge a ideia de atrelar pagamentos a entregas, como em um produto físico qualquer.
- No Scrum, o compromisso fechado de entregas ocorre por sprint.
- Uma ideia então seria pagar o fornecedor por sprint.


Faturamento X entregas

- Entretanto, na prática, as entregas de um sprint podem sofrer rejeições ou alterações, não por defeitos, mas sim por efeito natural do feedback.
- Isto desfaz o caráter “fechado” da entrega da qual depende o faturamento.

Contrato *"Time and material"* com teto de investimento

- Na linha de compor contratações que de alguma forma reduzam a percepção de risco do cliente, há esta modalidade.
- Trabalha-se com escopo aberto e a empreitada termina quando um orçamento definido for consumido.
- Não há obrigações do fornecedor após o término do orçamento, pois o escopo foi aberto.

Contrato "*Time and material*" com teto de investimento

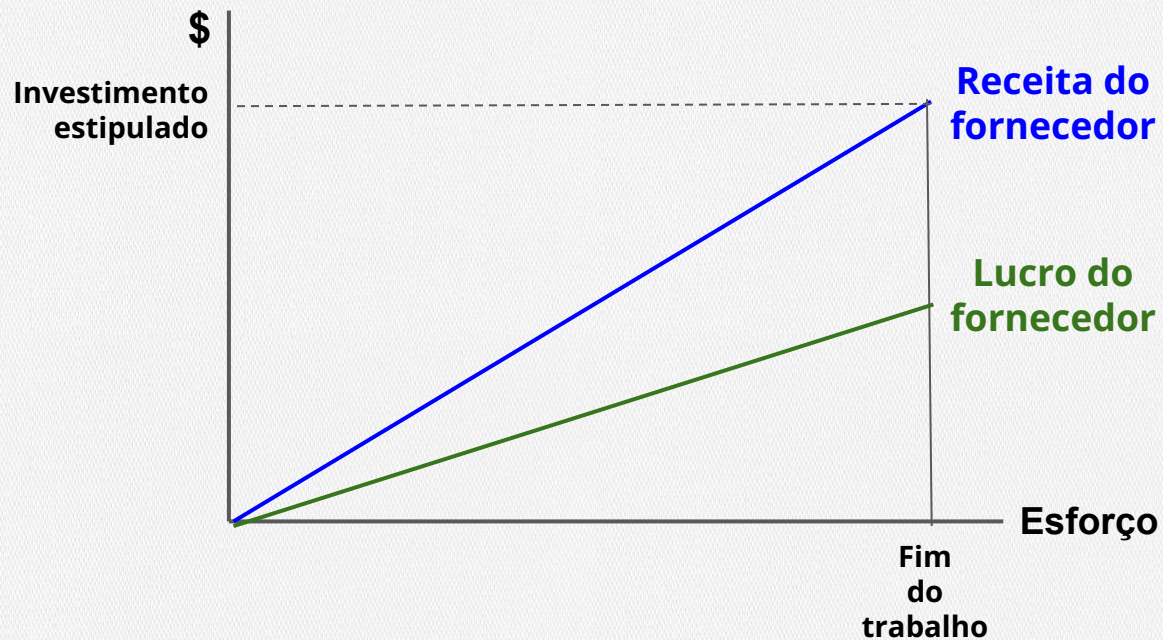


Contrato *"Money for Nothing, Changes for Free"*

- Esta modalidade, proposta por Jeff Sutherland (um dos introdutores do Scrum) apresenta uma divisão de riscos mais sofisticada.

Contrato “*Money for Nothing, Changes for Free*”

- Nesta contratação, é estipulado um valor total de investimento, o cliente **vai pagando por uma equipe** e vai **recebendo entregas, com escopo aberto**, como no Scrum clássico.
- Quando atingir o **retorno de investimento** que julgar adequado, o cliente pode interromper o contrato, a equipe encerra a atuação e é pago ao fornecedor o **lucro que seria remanescente** até o final do investimento total.

Contrato “Money for Nothing, Changes for Free”

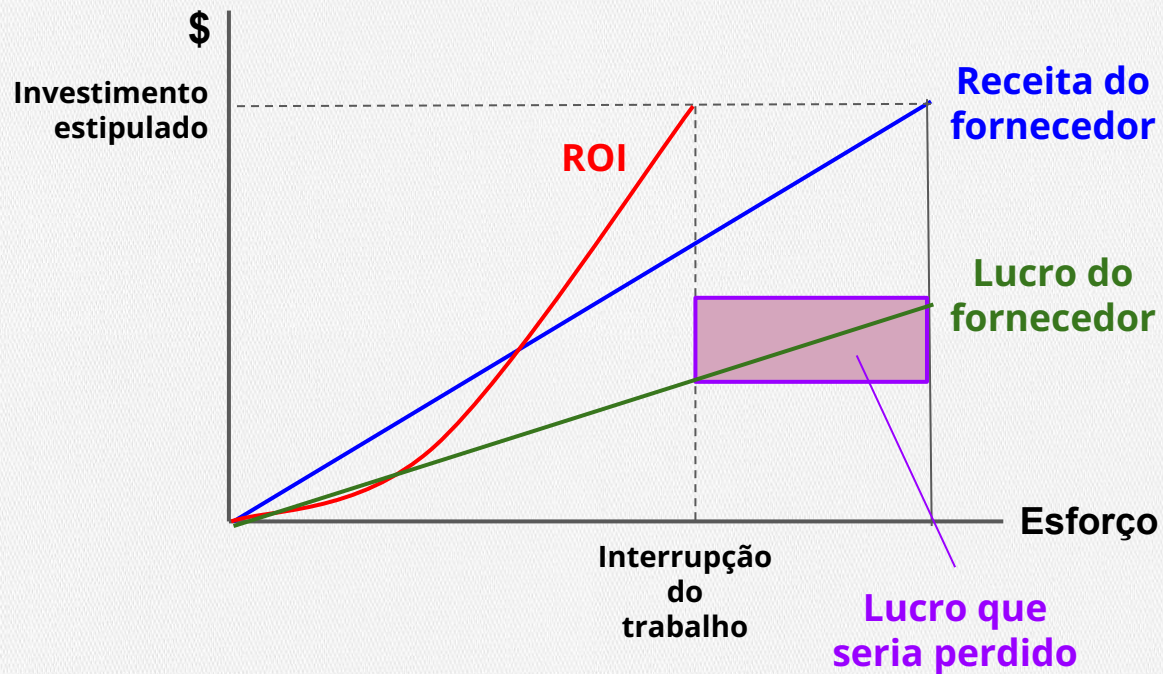


Aula 3: Gerenciamento de Aquisições

Relacionamento com fornecedores

Relacionamento com fornecedores

- Os contratos a preço, escopo e prazos fechados no ciclo waterfall para desenvolvimento de software colocavam enorme risco no colo do fornecedor.



Relacionamento com fornecedores

- O resultado disso eram prejuízos, conflitos e problemas de qualidade nos produtos.
- Ação <-----> Reação




Relacionamento com fornecedores

- No Ágil, o equacionamento de riscos é melhor.
- De qualquer forma, é importante a **confiança**.



Relacionamento com fornecedores

- **Pirâmide da confiança** (do Manifesto NoProjects)

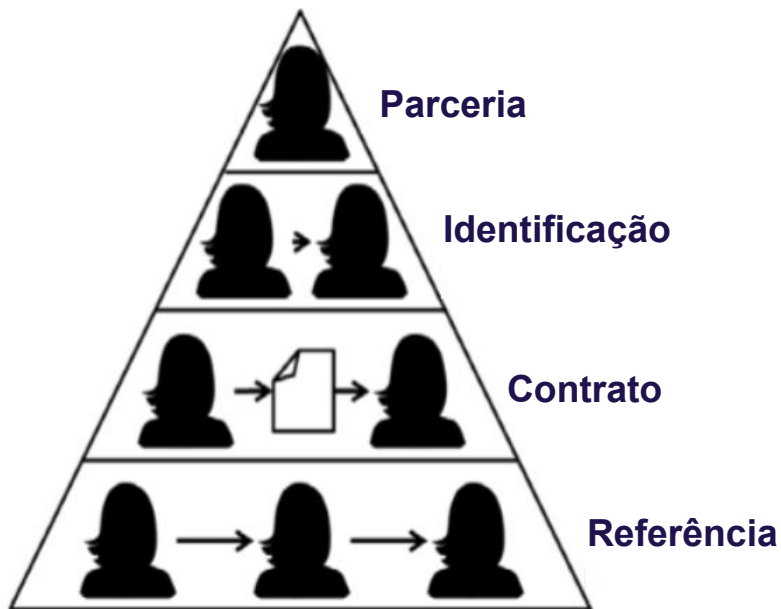


Aula 4: Gerenciamento da Integração

Planejamento

Planejamento no desenvolvimento de um produto complexo

- Processo definido X Processo empírico

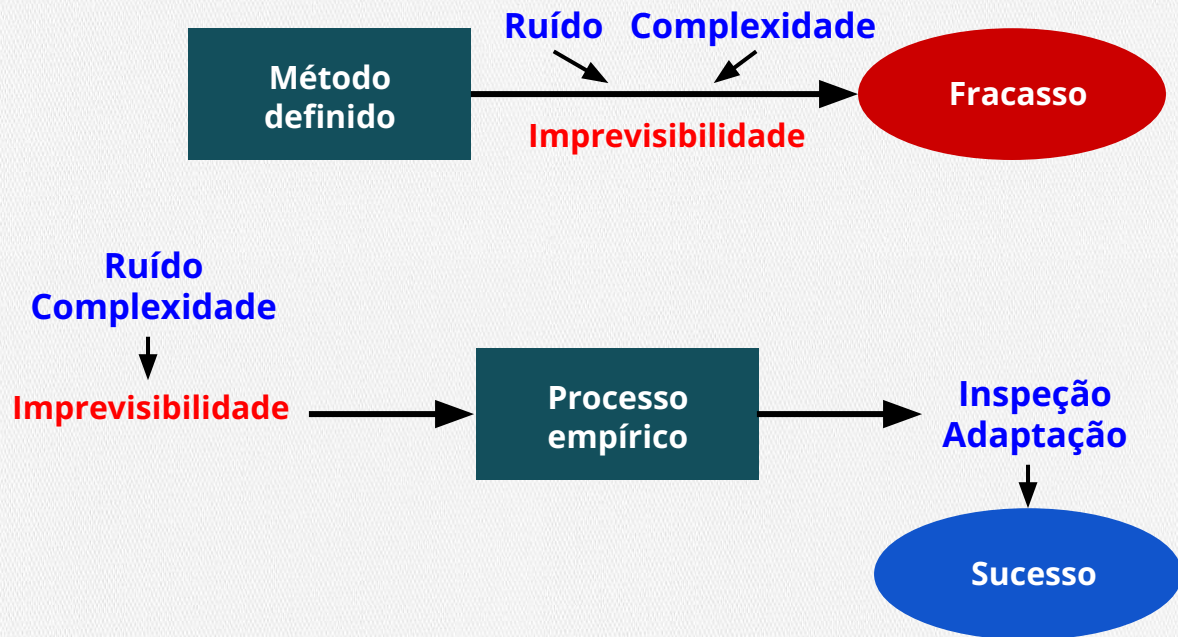

Planejamento inicial

- *Chartering*
 - É uma fase inicial de um projeto ágil onde o valor do mesmo para o negócio é discutido e entendido.
- Questões básicas:
 - Por que construiremos este produto?
 - Como saberemos se ele é bem-sucedido?
 - Quem é o público-alvo do projeto?

Planejamento inicial

- *Agile Project Charter*
 - É um documento que dá legitimidade ao projeto, apresentando aspectos da visão (por que), missão (o quê) e fatores críticos de sucesso.



Planejamento no Ágil

- **Visão** (do *Release Planning* do Scrum, por exemplo) é uma “precursora do planejamento”, dando as grandes diretrizes.
- O planejamento mais detalhado se dá em horizontes curtos e escopos limitados (*Sprint Planning* do Scrum, por exemplo).

Planejamento com base em lições aprendidas

- No gerenciamento de projetos clássico, as **lições aprendidas** em empreitadas anteriores similares são uma entrada para o planejamento.
- Tais lições aprendidas são guardadas nas chamadas **base de conhecimento**.



Planejamento com base em lições aprendidas

- Esta base de conhecimento, todavia, só faz sentido para produtos repetíveis e previsíveis.
- Em especial, o desenvolvimento de produtos **complicados** se beneficia bastante de lições aprendidas.



Planejamento com base em lições aprendidas

- Produtos **complexos**, todavia, são únicos, não se beneficiando tanto de lições aprendidas.
- Isto porque não há empreitadas anteriores tão similares.



Planejamento com base em lições aprendidas


- Portanto, segundo o Ágil, uma base de conhecimento:
 - Não deve ser usada para planejar e dirigir o trabalho.
 - Pode ser usada, isto sim, como uma referência de como fazer o trabalho.
 - Não gera a tão sonhada “repetibilidade”.

Aula 4: Gerenciamento da Integração

Monitoração e Controle

Monitoração e Controle

- Controle empírico

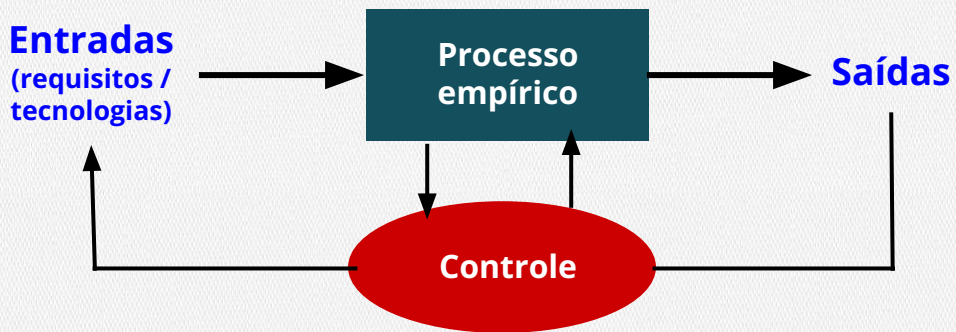

Monitoração e Controle

- Assumir previsibilidade cedo é catastrófico.
- Quem inspeciona “espera pelo inesperado”.



Monitoração e Controle

- O Ágil conta com algumas métricas, tais como:
 - **Velocidade do sprint** = quantidade de “story points” carregadas em um sprint.
 - **Lead time** = tempo de atravessamento de uma demanda (tempo entre o pedido do solicitante e a entrega).

Monitoração e Controle

- Momentos de monitoração e controle no Ágil:
 - Nas **reuniões diárias** = monitoração mais micro, para ajustar o trabalho do sprint, com atualização do *Sprint Burndown*.
 - Nas **Reviews** = também envolve de certa forma monitoração, mais macro, para ajustar a adição de valor ao negócio e atualizar o *Release Burndown*.

Monitoração e Controle

- Propósitos da monitoração e controle no Ágil:
 - Verificar, aprender e melhorar
 - Maximizar a eficácia e a eficiência



Aula 4: Gerenciamento da Integração

Gerenciamento de Mudanças

Gerenciamento de Mudanças

- Do desenvolvimento de software, a **mudança de escopo** pode ser considerada **quase certa**.
- Várias são as razões da mudança:
 - Novas ideias
 - Melhor compreensão de algo
 - Alterações no mercado
 - Alterações de tecnologia
 - Alterações de processos
 - Alterações legais
 - Mudança de direção
 - Etc.

Gerenciamento de Mudanças

- Na gestão tradicional de projetos *waterfall*, a questão da mudança é tratada com:
 - Processo de gestão de mudanças
 - *Change requests*
 - Comitê de gestão de mudanças
 - Reprogramações / replanejamentos

E no Ágil?

- O Ágil entende que, para produtos complexos (exemplo: software), as mudanças não são exceções.
- Então, os métodos “acomodam” as mudanças.
- No Ágil, a gestão das mudanças é **intrínseca ao processo**, não um processo disparado à parte.

E no Ágil?

- Uma reflexão abstrata: “Há uma forma de nunca enfrentar mudanças, que é mudar o que não foi feito ainda”.
- No Ágil, isto acontece? Como?



Aula 5: Riscos, Aquisições e Integração

Discussões práticas

Discussões práticas

- **Por que o gerenciamento de riscos é incomum no Ágil?**
 - Na verdade, o efetivo gerenciamento de riscos não é comum nem no *waterfall*.
 - No Ágil, os riscos são mais distribuídos e atenuados.
 - A questão do imediatismo.



Discussões práticas

- **Como anda o desenvolvimento de software waterfall?**
 - A adoção do Ágil tem sido progressivamente aceita.
 - Ainda há, todavia, quem queria comprar waterfall.
 - Cada vez menos gente quer vender nesta modalidade.



Discussões práticas

- **Como começar um projeto ágil na prática?**
 - Compor a **visão**.
 - Compor a **equipe**, de preferência no conceito de “estável”.
 - Elaborar um *Product Backlog* inicial.
 - Preparar **um estoque de User Stories**.

Discussões práticas

- **Como começar um projeto ágil na prática?**
 - Definir **padrões** de arquitetura, UX/UI e gestão da configuração.
 - Fazer um **sprint zero**, para afinar aspectos de UX/UI etc.

E, então:

- Iniciar os sprints de entregas normais.
- Cuidar da apuração de indicadores, dando especial atenção aos de adição de valor ao negócio.

Aula 5: Riscos, Aquisições e Integração

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios




Fórum



Você
aprendeu...

Conclusões

1. **Riscos** são eventos incertos que, se ocorrerem, trarão impactos a qualquer tipo de projeto (*waterfall* ou ágeis). Trata-se portanto de um tema universal.

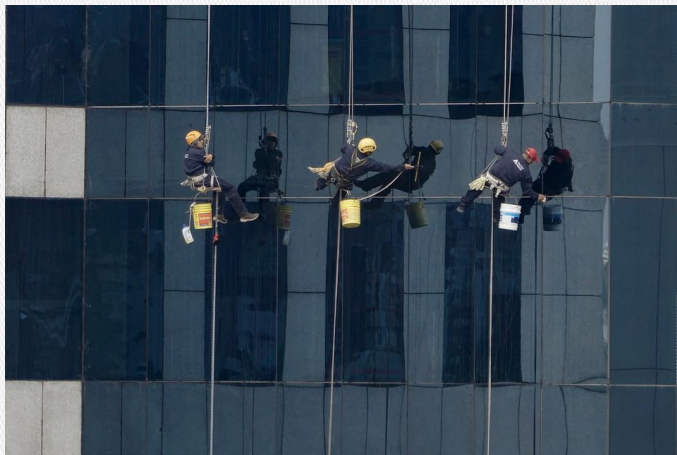

Conclusões

2. Os principais **fatores** de um risco, determinados na sua **análise qualitativa**, são a sua **probabilidade** e seu **impacto**, sendo que a composição de ambos gera o **nível** ou **grau** do risco.

Análise qualitativa do risco		
Probabilidade	Impacto	Nível
90%	3	2,7
70%	3	2,1
90%	2	1,8
50%	3	1,5
70%	2	1,4
50%	2	1,0
90%	1	0,9
25%	3	0,8
70%	1	0,7
25%	2	0,5
50%	1	0,5
10%	3	0,3
25%	1	0,3
10%	2	0,2
10%	1	0,1

Conclusões

3. O Ágil, por seu caráter iterativo e incremental, traz uma **pulverização** dos riscos (distribuição mais uniforme, ao longo da série de pequenas entregas parciais).



Conclusões

4. Riscos devem receber um enunciado claro (por exemplo, pela sintaxe **< efeito > devido a < causa >**) e devem ser registrados, com priorização por grau ou nível.




Conclusões

5. Riscos devem contar com um **plano de resposta**, que consiste, no mínimo, por **ações de mitigação** e **ações de contingência**.




Conclusões

6. Aquisições de produtos complexos via projetos com ciclo de vida waterfall costumam ter riscos exagerados e resultar em fracassos.



Conclusões

7. Há contratações de desenvolvimento de produtos complexos baseadas no Ágil que costumam ser melhores, como a *"time & material" com teto de investimento* e a *"money for nothing, changes for free"*.

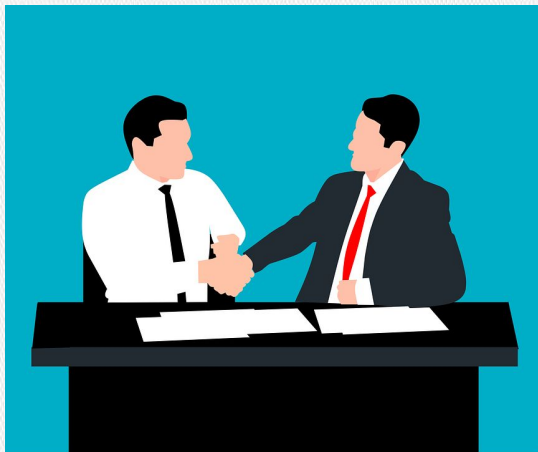

Conclusões

8. Independentemente do tipo e contratação, é muito importante a **confiança** nos fornecedores.



Conclusões

9. A **integração**, no âmbito da gestão de projetos, consiste na harmonização de diversos processos rumo a uma boa condução dos trabalhos. Esta integração manifesta-se, principalmente, no **planejamento** e na **monitoração e controle**.



Conclusões

10. Processos empíricos, ao contrário dos definidos, partem do reconhecimento do **ruído** e da **complexidade** (e, portanto, da **imprevisibilidade**) para reagirmos aos fatos em vez de tentarmos “planejar o implanejável”.




Conclusões

11. No Ágil, há uma diretriz macro proporcionada pela **visão** e o planejamento mais detalhado ocorre somente por iteração.




Conclusões

12. No Ágil, as **lições aprendidas** (e suas **bases de conhecimento**) não são vistas com algo que proporciona “previsibilidade” aos projetos, mas sim um apoio.

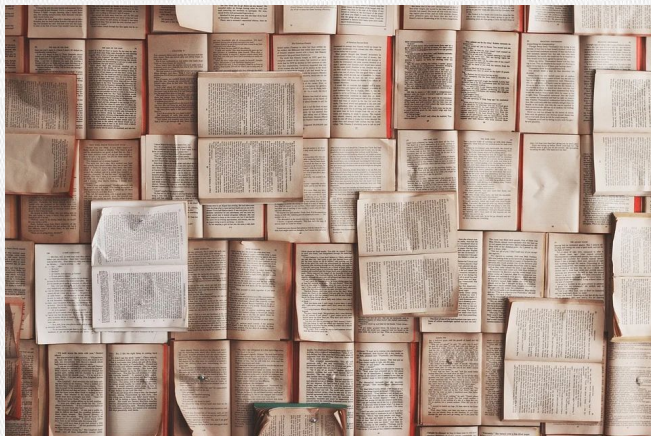

Conclusões

13. O Ágil possui artefatos e rituais e monitoração e controle. Por exemplo, os *burndowns*, as reuniões diárias, uma parte do caráter das *Reviews* etc.

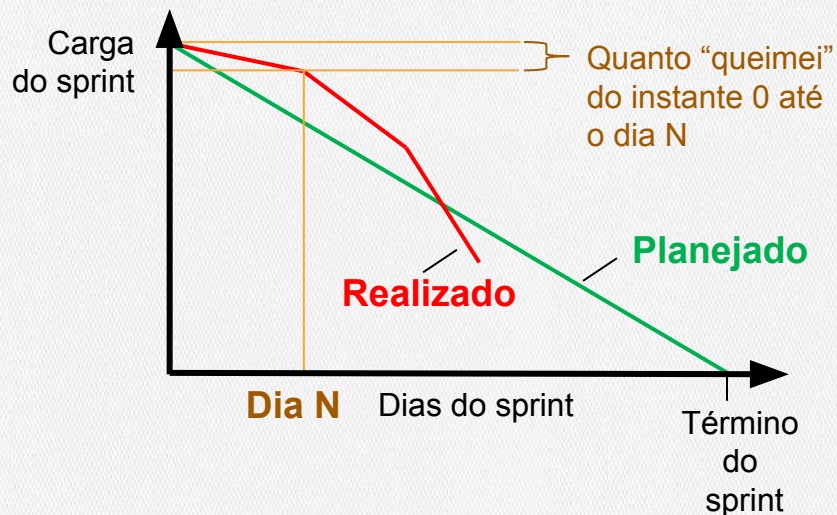


Conclusões

14. A monitoração e o controle, na conceituação do Ágil, visam **verificar**, **aprender** e **melhorar**, e não pressionar as pessoas ou chefiar seus trabalhos.



Conclusões

15. A acomodação das mudanças no Ágil são intrínsecas aos métodos, não demandando mecanismos de exceção.





Avalie e comente
