

Certificação PMI-ACP

Simulado do exame

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

- [Orientações](#) 4
- [Preparando o ambiente](#) 10
- [Questões 1 a 5](#) 13
- [Questões 6 a 10](#) 24
- [Questões 11 a 15](#) 36

Aula 2: Questões 16 a 35

- [Questões 16 a 20](#) 47
- [Questões 21 a 25](#) 59
- [Questões 26 a 30](#) 70

- [Questões 31 a 35](#) 82

Aula 3: Questões 36 a 55

- [Questões 36 a 40](#) 93
- [Questões 41 a 45](#) 105
- [Questões 46 a 50](#) 117
- [Questões 51 a 55](#) 129

Aula 4: Questões 56 a 75

- [Questões 56 a 60](#) 140
- [Questões 61 a 65](#) 152

- [Questões 66 a 70](#) 163

- [Questões 71 a 75](#) 174

Aula 5: Questões 76 a 90

- [Questões 76 a 80](#) 185
- [Questões 81 a 85](#) 196
- [Questões 86 a 90](#) 208

Sumário

Aula 6: Questões 91 a 105

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Questões 91 a 95 | 220 |
| • Questões 96 a 100 | 231 |
| • Questões 101 a 105 | 242 |

Aula 7: Questões 106 a 120

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Questões 106 a 110 | 253 |
| • Questões 111 a 115 | 264 |
| • Questões 116 a 120 | 275 |
| • Conclusão | 286 |

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

Orientações

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Offices*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Devs com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o décimo curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação **PMI-ACP ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner")**.
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil!**

O que será tratado neste curso

- Teremos um simulado com 120 questões (número do exame real).
- Você poderá então recapitular conceitos, praticar e dar os toques finais na sua preparação.

Benefícios para quem participa:

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

Preparando o ambiente

Sugestão de como fazer o simulado

- Para cada questão, pause o vídeo após o enunciado e a apresentação das alternativas.
- Reflita então sobre como responderia.
- Continue o vídeo, quando então alternativa correta será apresentada com comentários gerais.

Sugestão de como fazer o simulado

- Tome nota do que julgar relevante dos comentários, em especial quando você errar a resposta.
- O mais importante é revisar / lapidar seus conhecimentos com base nos comentários.

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

Questões 1 a 5

1. Uma melhor forma de um “stakeholder” qualquer de um projeto ágil que segue o Scrum saber do andamento dos trabalhos é:

- a) Perguntar ao Scrum Master, evitando assim interrupções nas atividades da equipe
- b) Consultar o “product backlog”
- c) Observar o quadro do projeto, o “burndown” ou outra forma de “information radiator”
- d) Participar da reunião diária (“stand-up meeting”), quando poderá resolver diretamente com a equipe suas dúvidas

1. Uma melhor forma de um “stakeholder” qualquer de um projeto ágil que segue o Scrum saber do andamento dos trabalhos é:

- a) Perguntar ao Scrum Master, evitando assim interrupções nas atividades da equipe
- b) Consultar o “product backlog”
- c) Observar o quadro do projeto, o “burndown” ou outra forma de “information radiator”**
- d) Participar da reunião diária (“stand-up meeting”), quando poderá resolver diretamente com a equipe suas dúvidas

2. Em um projeto Scrum, a composição do “product backlog” é responsabilidade de:

- a) Scrum Master
- b) Product Owner
- c) Equipe Scrum
- d) “Sponsor” do projeto

2. Em um projeto Scrum, a composição do “product backlog” é responsabilidade de:

- a) Scrum Master
- b) Product Owner**
- c) Equipe Scrum
- d) “Sponsor” do projeto

3. Uma organização está com muita dificuldade em estimar a velocidade de suas equipes ágeis. A melhor medida a tomar diante desta situação é:

- a) Sugerir que sejam medidas as velocidades das primeiras iterações de cada projeto, o que dará uma pista da velocidade de cada projeto específico.
- b) Instituir um padrão de unidades de medida de “user stories” e um processo bem pensado de “planning poker”.
- c) Sugerir a aplicação de uma técnica de estimativa paramétrica, como a Análise de Pontos de Função, e com o tempo descobrir a produtividade da equipe.
- d) Recuperar ou começar a guardar informações históricas sobre as velocidades dos projetos ágeis da organização.

3. Uma organização está com muita dificuldade em estimar a velocidade de suas equipes ágeis. A melhor medida a tomar diante desta situação é:

- a) Sugerir que sejam medidas as velocidades das primeiras iterações de cada projeto, o que dará uma pista da velocidade de cada projeto específico.**
- b) Instituir um padrão de unidades de medida de “user stories” e um processo bem pensado de “planning poker”.
- c) Sugerir a aplicação de uma técnica de estimativa paramétrica, como a Análise de Pontos de Função, e com o tempo descobrir a produtividade da equipe.
- d) Recuperar ou começar a guardar informações históricas sobre as velocidades dos projetos ágeis da organização.

4. Em uma organização que adota consistentemente métodos ágeis, todos os instrumentos seguintes ajudam a ter uma ideia geral da visão do projeto, exceto:

- a) O “product backlog” e as “user stories”
- b) A "caixa" do produto (“vision box”)
- c) Uma parte do “release planning”
- d) Um modelo em escala reduzida (protótipo)

4. Em uma organização que adota consistentemente métodos ágeis, todos os instrumentos seguintes ajudam a ter uma ideia geral da visão do projeto, exceto:

- a) O “product backlog” e as “user stories”**
- b) A "caixa" do produto (“vision box”)
- c) Uma parte do “release planning”
- d) Um modelo em escala reduzida (protótipo)

5. "Valor", em um projeto ágil de software, é melhor medido:

- a) Pelo ROI advindo das entregas de peças priorizadas de software funcionando
- b) Pela percepção do Product Owner, conforme seus critérios de qualidade previamente acordados
- c) Pela velocidade da equipe de desenvolvimento
- d) Pela produtividade da equipe de desenvolvimento

5. "Valor", em um projeto ágil de software, é melhor medido:

- a) **Pelo ROI advindo das entregas de peças priorizadas de software funcionando**
- b) Pela percepção do Product Owner, conforme seus critérios de qualidade previamente acordados
- c) Pela velocidade da equipe de desenvolvimento
- d) Pela produtividade da equipe de desenvolvimento

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

Questões 6 a 10

6. No "pair programming" da abordagem ágil "Extreme Programming":

- a) Os desenvolvedores alternam revisões no código escrito individualmente.
- b) Um desenvolvedor codifica e o outro testa logo em seguida, em períodos curtos.
- c) Os casos de teste são feitos antes da codificação e o código é escrito para passar nestes testes, e nada mais.
- d) Dois desenvolvedores usam o mesmo computador ao mesmo tempo, auto-organizando-se.

6. No "pair programming" da abordagem ágil "Extreme Programming":

- a) Os desenvolvedores alternam revisões no código escrito individualmente.
- b) Um desenvolvedor codifica e o outro testa logo em seguida, em períodos curtos.
- c) Os casos de teste são feitos antes da codificação e o código é escrito para passar nestes testes, e nada mais.
- d) Dois desenvolvedores usam o mesmo computador ao mesmo tempo, auto-organizando-se.**

7. Entre as sessões abaixo, indique aquela que normalmente não é “timeboxed” em um projeto ágil:

- a) Reunião diária (“stand-up meeting”)
- b) Reunião de planejamento da iteração
- c) Reunião de retrospectiva da iteração
- d) Reunião de resolução de “issues” técnicos

7. Entre as sessões abaixo, indique aquela que normalmente não é “timeboxed” em um projeto ágil:

- a) Reunião diária (“stand-up meeting”)
- b) Reunião de planejamento da iteração
- c) Reunião de retrospectiva da iteração
- d) Reunião de resolução de “issues” técnicos**

8. A principal característica de uma equipe autogerenciada é:

- a) Escolher seu próprio gestor
- b) Decidir como distribuir o trabalho
- c) Ser multifuncional e sem papéis definidos
- d) Não precisar de nenhum estímulo externo que a motive

8. A principal característica de uma equipe autogerenciada é:

- a) Escolher seu próprio gestor
- b) Decidir como distribuir o trabalho**
- c) Ser multifuncional e sem papéis definidos
- d) Não precisar de nenhum estímulo externo que a motive

9. Um grande auxílio à "osmotic communication" é:

- a) A "co-location"
- b) O uso de recursos avançados de tecnologia
- c) O isolamento da equipe de interrupções e interferências externas
- d) A autogestão da equipe

9. Um grande auxílio à "osmotic communication" é:

a) A "co-location"

b) O uso de recursos avançados de tecnologia

c) O isolamento da equipe de interrupções e interferências externas

d) A autogestão da equipe


10. Em um diagrama de fluxo cumulativo do Kanban, o segmento horizontal entre as linhas de "backlog" e "done" indicam:

- a) A quantidade de itens em processamento
- b) A quantidade de itens prontos
- c) O "lead time"
- d) A quantidade de itens entregues prontos por período de tempo

10. Em um diagrama de fluxo cumulativo do Kanban, o segmento horizontal entre as linhas de "backlog" e "done" indicam:

- a) A quantidade de itens em processamento
- b) A quantidade de itens prontos
- c) O "lead time"**
- d) A quantidade de itens entregues prontos por período de tempo

10. Em um diagrama de fluxo cumulativo do Kanban, o segmento horizontal entre as linhas de "backlog" e "done" indicam:

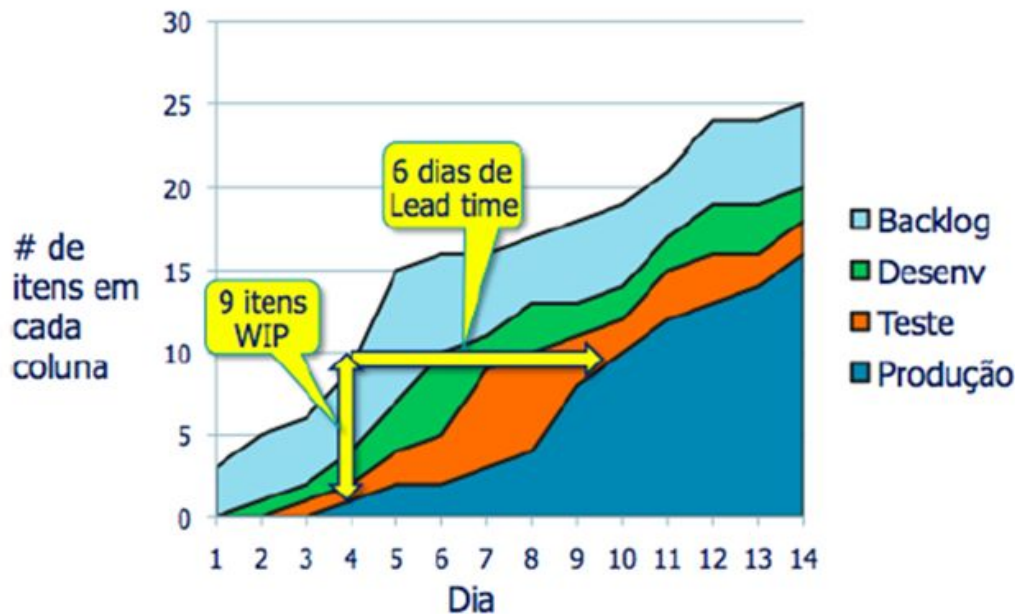

Aula 1: Orientações e questões 1 a 15

Questões 11 a 15

11. O que mais se aproxima do conceito de "agilidade" nos métodos ágeis de gestão é:

- a) Grande rapidez em construir produtos complexos
- b) Flexibilidade em ambientes complexos
- c) Ausência de vacilações ou mudanças de escopo ao longo do projeto
- d) Dinamismo da equipe de desenvolvimento e dos usuários

11. O que mais se aproxima do conceito de "agilidade" nos métodos ágeis de gestão é:

- a) Grande rapidez em construir produtos complexos
- b) Flexibilidade em ambientes complexos**
- c) Ausência de vacilações ou mudanças de escopo ao longo do projeto
- d) Dinamismo da equipe de desenvolvimento e dos usuários

12. Um problema do ciclo de vida "em cascata" ("waterfall") em projetos de produtos como o software consiste em:

- a) Grande período de tempo decorrido entre concepção e validação
- b) Falta de aderência ao PMBOK ou outro modelo consistente
- c) Documentação insuficiente
- d) Engajamento da equipe insuficiente

12. Um problema do ciclo de vida "em cascata" ("waterfall") em projetos de produtos como o software consiste em:

- a) Grande período de tempo decorrido entre concepção e validação**
- b) Falta de aderência ao PMBOK ou outro modelo consistente
- c) Documentação insuficiente
- d) Engajamento da equipe insuficiente

13. A reunião realizada ao final de um “Sprint” do Scrum para apresentar uma nova versão do produto ao Product Owner é a:

- a) “Release review”
- b) “Sprint retrospective”
- c) “Sprint review”
- d) “Status report”

13. A reunião realizada ao final de um “Sprint” do Scrum para apresentar uma nova versão do produto ao Product Owner é a:

- a) “Release review”
- b) “Sprint retrospective”
- c) “Sprint review”**
- d) “Status report”

14. A doutrina ágil propõe que atividades como o desenvolvimento de software sejam:

- a) Baseadas em um processo definido simples, com funções bem definidas e entregas incrementais.
- b) Baseadas em um processo flexível e empírico.
- c) Realizadas sem documentação e, em vez disto, com a presença constante dos usuários ou de representantes dos usuários na equipe de construção.
- d) Realizadas de forma rápida e com uma supervisão firme mas ao mesmo tempo motivadora.

14. A doutrina ágil propõe que atividades como o desenvolvimento de software sejam:

- a) Baseadas em um processo definido simples, com funções bem definidas e entregas incrementais.
- b) Baseadas em um processo flexível e empírico.**
- c) Realizadas sem documentação e, em vez disto, com a presença constante dos usuários ou de representantes dos usuários na equipe de construção.
- d) Realizadas de forma rápida e com uma supervisão firme mas ao mesmo tempo motivadora.

15. Uma organização está relutante em adotar métodos ágeis e você tem como missão tentar convencê-la de que vale a pena. Para isto, qual discurso você considera mais correto?

- a) Os métodos ágeis eliminam tarefas que não agregam valor (documentação, interações com os usuários, uso de procedimentos rígidos, reuniões) e focam no que efetivamente traz valor (produto entregue).
- b) Os métodos ágeis fazem com que as equipes fiquem muito mais motivadas, o que aumenta a produtividade e qualidade dos trabalhos.
- c) A abordagem tradicional ("waterfall") já provou que não funciona em nenhum tipo de projeto, pois exige que se tenha todo o escopo definido logo no início.
- d) Os métodos ágeis se baseiam na entrega de produtos parciais o mais cedo possível, para que problemas possam ser antecipados e alguma versão do produto, ainda que incompleta, já possa ser utilizada.

15. Uma organização está relutante em adotar métodos ágeis e você tem como missão tentar convencê-la de que vale a pena. Para isto, qual discurso você considera mais correto?

- a) Os métodos ágeis eliminam tarefas que não agregam valor (documentação, interações com os usuários, uso de procedimentos rígidos, reuniões) e focam no que efetivamente traz valor (produto entregue).
- b) Os métodos ágeis fazem com que as equipes fiquem muito mais motivadas, o que aumenta a produtividade e qualidade dos trabalhos.
- c) A abordagem tradicional ("waterfall") já provou que não funciona em nenhum tipo de projeto, pois exige que se tenha todo o escopo definido logo no início.
- d) Os métodos ágeis se baseiam na entrega de produtos parciais o mais cedo possível, para que problemas possam ser antecipados e alguma versão do produto, ainda que incompleta, já possa ser utilizada.**

Aula 2: Questões 16 a 35

Questões 16 a 20


16. O termo "bucket" se relaciona a:

- a) Uma faixa que caracteriza um tamanho.
- b) Um impedimento.
- c) Um limite de tempo bem definido.
- d) Um conjunto de "stories" que foram selecionadas para uma iteração.

16. O termo "bucket" se relaciona a:

- a) **Uma faixa que caracteriza um tamanho.**
- b) Um impedimento.
- c) Um limite de tempo bem definido.
- d) Um conjunto de "stories" que foram selecionadas para uma iteração.

16. O termo "bucket" se relaciona a:

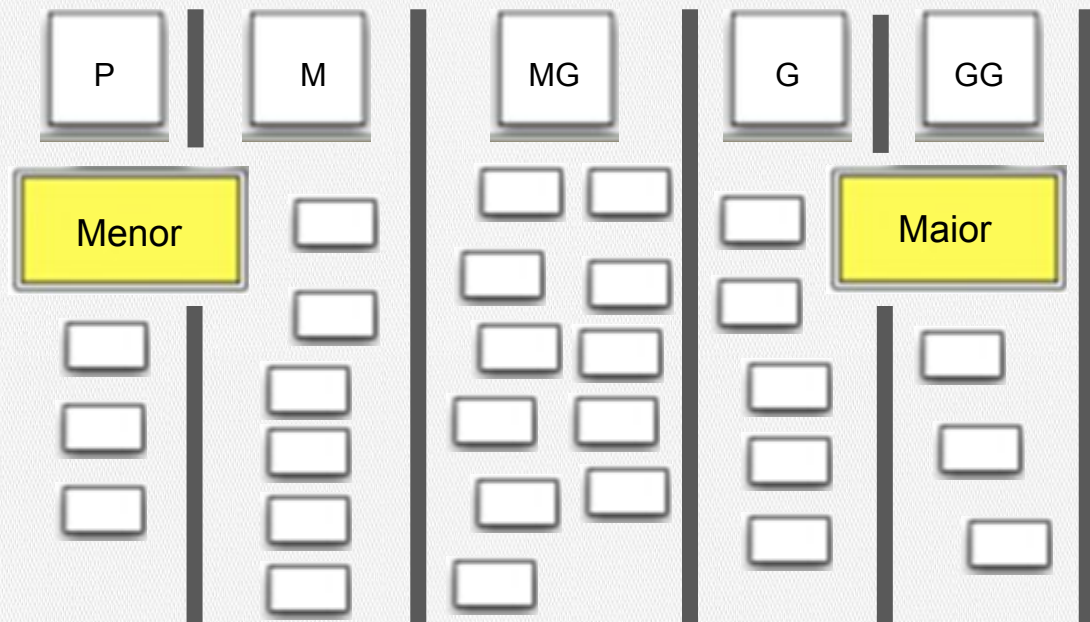

17. Uma liderança capaz de perceber muito facilmente emoções dos outros pode ser considerada:

- a) Detentora de elevado grau de inteligência emocional
- b) Empática com as pessoas
- c) Sentimental
- d) Uma liderança servidora

17. Uma liderança capaz de perceber muito facilmente emoções dos outros pode ser considerada:

- a) Detentora de elevado grau de inteligência emocional**
- b) Empática com as pessoas
- c) Sentimental
- d) Uma liderança servidora

18. Na abordagem Kanban, o que é o WIP ("Work In Progress")?

- a) É a quantidade máxima de itens que podem ser trabalhados em um estágio do sistema de produção.
- b) É a quantidade de itens que estão sendo trabalhados em um estágio do sistema de produção.
- c) Corresponde ao total de itens acabados menos o total de itens que estão no "backlog".
- d) É o processo de produção definido (ou como o trabalho será feito em cada estágio).

18. Na abordagem Kanban, o que é o WIP ("Work In Progress")?

- a) É a quantidade máxima de itens que podem ser trabalhados em um estágio do sistema de produção.
- b) É a quantidade de itens que estão sendo trabalhados em um estágio do sistema de produção.**
- c) Corresponde ao total de itens acabados menos o total de itens que estão no "backlog".
- d) É o processo de produção definido (ou como o trabalho será feito em cada estágio).

19. Quando Product Owner detecta um defeito no produto entregue, ao final de uma iteração, tal defeito deve:

- a) Gerar um item de correção que será executado em alguma próxima iteração.
- b) Se possível, ser corrigido na hora, visando maximizar o volume de "dones" da iteração.
- c) Ser corrigido após a reunião com Product Owner, antes da iteração imediatamente seguinte.
- d) Ter sua causa-origem identificada na hora, para evitar que se repita.

19. Quando Product Owner detecta um defeito no produto entregue, ao final de uma iteração, tal defeito deve:

- a) **Gerar um item de correção que será executado em alguma próxima iteração.**
- b) Se possível, ser corrigido na hora, visando maximizar o volume de "dones" da iteração.
- c) Ser corrigido após a reunião com Product Owner, antes da iteração imediatamente seguinte.
- d) Ter sua causa-origem identificada na hora, para evitar que se repita.

20. O conceito de "earned value" (valor agregado) se relaciona a:

- a) Valor consumido no projeto (investimento)
- b) Valor de entrega completada
- c) ROI ("Return On Investment")
- d) IRR ("Internal Rate of Return")

20. O conceito de "earned value" (valor agregado) se relaciona a:

a) Valor consumido no projeto (investimento)

b) Valor de entrega completada

c) ROI ("Return On Investment")

d) IRR ("Internal Rate of Return")

Aula 2: Questões 16 a 35

Questões 21 a 25

21. Qual seria um boa ação para uma “user story” grande demais para ser estimada?

- a) Lançar mão de especialistas ou de pessoas que já tenham trabalhado com “user stories” semelhantes.
- b) Tentar desmembrar a “user story”, com ajuda de Product Owner.
- c) Contar com a presença de Product Owner para explicar melhor a “user story”.
- d) Utilizar a técnica de “affinity estimating”.

21. Qual seria uma boa ação para uma “user story” grande demais para ser estimada?

- a) Lançar mão de especialistas ou de pessoas que já tenham trabalhado com “user stories” semelhantes.
- b) Tentar desmembrar a “user story”, com ajuda de Product Owner.**
- c) Contar com a presença de Product Owner para explicar melhor a “user story”.
- d) Utilizar a técnica de “affinity estimating”.

22. Se um projeto ágil corretamente conduzido for cancelado quando 3/4 do tempo total previsto tiver transcorrido, o que teremos de concreto?

- a) A visão do projeto detalhada em um conjunto completo de especificações funcionais.
- b) Um conjunto completo de “user stories” e código correspondente para ser integrado.
- c) Efetivamente falando, nada.
- d) Um software incompleto (com funcionalidades faltantes) rodando.

22. Se um projeto ágil corretamente conduzido for cancelado quando 3/4 do tempo total previsto tiver transcorrido, o que teremos de concreto?

- a) A visão do projeto detalhada em um conjunto completo de especificações funcionais.
- b) Um conjunto completo de “user stories” e código correspondente para ser integrado.
- c) Efetivamente falando, nada.
- d) Um software incompleto (com funcionalidades faltantes) rodando.**

23. No que consiste a chamada "osmotic communication" (comunicação osmótica)?

- a) Passagem de informações entre setores de uma organização ou entre equipes de maneira fluida e dinâmica.
- b) Todos em uma equipe estarem em contato com o que está sendo falado e com o que está acontecendo.
- c) Comunicação facilitada por ferramentas de colaboração.
- d) Transmissão de informações de uma pessoa, grupo ou setor que detém mais conhecimento para outros que estão mais isolados ou com menos conhecimento.

23. No que consiste a chamada "osmotic communication" (comunicação osmótica)?

- a) Passagem de informações entre setores de uma organização ou entre equipes de maneira fluida e dinâmica.
- b) Todos em uma equipe estarem em contato com o que está sendo falado e com o que está acontecendo.**
- c) Comunicação facilitada por ferramentas de colaboração.
- d) Transmissão de informações de uma pessoa, grupo ou setor que detém mais conhecimento para outros que estão mais isolados ou com menos conhecimento.

24. As práticas seguintes são associadas ao Extreme Programming, exceto:

- a) Refatoração de código, visando deixá-lo o mais limpo possível, bem como padrões de codificação bem definidos.
- b) Integração contínua de código.
- c) Simplicidade no projeto, com artefatos enxutos e o menor nível de formalismo possível.
- d) Programador e usuário construindo o produto lado a lado, utilizando o mesmo computador.

24. As práticas seguintes são associadas ao Extreme Programming, exceto:

- a) Refatoração de código, visando deixá-lo o mais limpo possível, bem como padrões de codificação bem definidos.
- b) Integração contínua de código.
- c) Simplicidade no projeto, com artefatos enxutos e o menor nível de formalismo possível.
- d) Programador e usuário construindo o produto lado a lado, utilizando o mesmo computador.**

25. Com relação a equipes que participam de projetos ágeis, distribuídas geograficamente, é correto afirmar que:

- a) É impossível o atingimento dos objetivos advindos das abordagens ágeis neste tipo de arranjo.
- b) A distância entre os membros exige a adoção de ferramental de colaboração.
- c) O melhor a fazer é dividir o trabalho de forma que cada localidade cuide de um assunto (por exemplo, uma equipe cuidando de codificação, outra de testes e assim por diante).
- d) É mandatório que periodicamente representantes de cada local se reúnam para realizar um "Scrum de Scrums".

25. Com relação a equipes que participam de projetos ágeis, distribuídas geograficamente, é correto afirmar que:

- a) É impossível o atingimento dos objetivos advindos das abordagens ágeis neste tipo de arranjo.
- b) A distância entre os membros exige a adoção de ferramental de colaboração.**
- c) O melhor a fazer é dividir o trabalho de forma que cada localidade cuide de um assunto (por exemplo, uma equipe cuidando de codificação, outra de testes e assim por diante).
- d) É mandatório que periodicamente representantes de cada local se reúnam para realizar um "Scrum de Scrums".

Aula 2: Questões 16 a 35

Questões 26 a 30

26. Para um tratamento adequado de requisitos não funcionais de um projeto ágil, vale lançar mão de:

- a) Um protótipo ou “wireframe”
- b) Uma sessão de “spike”
- c) Uma sessão de “stanking”
- d) Uma “sand box”

26. Para um tratamento adequado de requisitos não funcionais de um projeto ágil, vale lançar mão de:

- a) Um protótipo ou “wireframe”
- b) Uma sessão de “spike”
- c) Uma sessão de “stanking”**
- d) Uma “sand box”


27. O "risk burndown chart" mostra a evolução do chamado "risk exposure" ao longo do tempo. Para obtermos o "risk exposure", o que devemos fazer?

- a) Ter um registro dos riscos do projeto e, para cada um, multiplicar seu impacto em dias por sua probabilidade, realizando então a somatória destes valores para cada iteração.
- b) Somar a quantidade de dias de impacto advindas de todos os riscos do projeto a cada dia.
- c) Manter um registro dos riscos do projeto atualizado e contabilizar quanto em valor monetário foi economizado por conta da mitigação de tais riscos, em cada iteração.
- d) Apurar o valor monetário associado a todos os riscos do projeto e dividir esta soma pelo valor estimado do projeto (EAC) em cada iteração.

27. O "risk burndown chart" mostra a evolução do chamado "risk exposure" ao longo do tempo. Para obtermos o "risk exposure", o que devemos fazer?

- a) Ter um registro dos riscos do projeto e, para cada um, multiplicar seu impacto em dias por sua probabilidade, realizando então a somatória destes valores para cada iteração.**
- b) Somar a quantidade de dias de impacto advindas de todos os riscos do projeto a cada dia.
- c) Manter um registro dos riscos do projeto atualizado e contabilizar quanto em valor monetário foi economizado por conta da mitigação de tais riscos, em cada iteração.
- d) Apurar o valor monetário associado a todos os riscos do projeto e dividir esta soma pelo valor estimado do projeto (EAC) em cada iteração.

27. O "risk burndown chart" mostra a evolução do chamado "risk exposure" ao longo do tempo. Para obtermos o "risk exposure", o que devemos fazer?

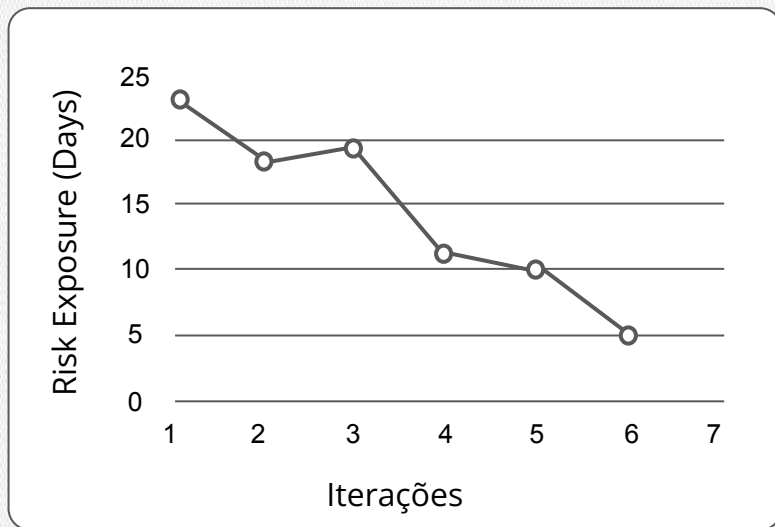

Risk Exposure (Days) = $\sum$ Probabilidades x Impactos em dias de todos os riscos do projeto

28. O que é melhor que uma equipe Scrum faça enquanto um impedimento do projeto não é resolvido?

- a) Aguardar, dado que o Scrum Master já foi notificado e tem a missão de providenciar a resolução ou buscar alguém na organização que resolva.
- b) Repetir a declaração do impedimento em todas as reuniões diárias, insistentemente, até que ele seja resolvido.
- c) Escalar a questão depois de algum tempo, com ciência do Scrum Master ou através deste.
- d) Dedicar parte da iteração para fazer uma força-tarefa visando resolver o impedimento, com participação de todos.

28. O que é melhor que uma equipe Scrum faça enquanto um impedimento do projeto não é resolvido?

- a) Aguardar, dado que o Scrum Master já foi notificado e tem a missão de providenciar a resolução ou buscar alguém na organização que resolva.
- b) Repetir a declaração do impedimento em todas as reuniões diárias, insistentemente, até que ele seja resolvido.**
- c) Escalar a questão depois de algum tempo, com ciência do Scrum Master ou através deste.
- d) Dedicar parte da iteração para fazer uma força-tarefa visando resolver o impedimento, com participação de todos.

29. Em uma reunião diária do Scrum (“stand-up meeting”) um membro da equipe propõe que esta cerimônia não seja mais adotada. Diante disto, a melhor atitude do Scrum Master é:

- a) Colocar o ponto para opinião de todos os membros da equipe presentes, dado que um time auto-gerenciado tem de deliberar consensualmente sobre as técnicas utilizadas.
- b) Explicar que aquele momento (a reunião diária) não é o correto para discutir este tipo de assunto e agendar uma reunião de retrospectiva logo em seguida para deliberar quanto à proposição.
- c) Explicar que isto viola o Scrum, puxando imediatamente o foco para as três perguntas básicas do “daily scrum”.
- d) Tratar do assunto somente no planejamento da próxima iteração, retirando das atividades da mesma a reunião diária se a equipe decidir que isto faz sentido.

29. Em uma reunião diária do Scrum (“stand-up meeting”) um membro da equipe propõe que esta cerimônia não seja mais adotada. Diante disto, a melhor atitude do Scrum Master é:

- a) Colocar o ponto para opinião de todos os membros da equipe presentes, dado que um time auto-gerenciado tem de deliberar consensualmente sobre as técnicas utilizadas.
- b) Explicar que aquele momento (a reunião diária) não é o correto para discutir este tipo de assunto e agendar uma reunião de retrospectiva logo em seguida para deliberar quanto à proposição.
- c) Explicar que isto viola o Scrum, puxando imediatamente o foco para as três perguntas básicas do “daily scrum”.**
- d) Tratar do assunto somente no planejamento da próxima iteração, retirando das atividades da mesma a reunião diária se a equipe decidir que isto faz sentido.

30. Assinale a alternativa correta quanto às abordagens ágeis de desenvolvimento:

- a) Elas se aplicam bem a qualquer produto.
- b) Elas sempre garantem entregas mais rápidas de produtos finais.
- c) Elas canalizam o esforço que seria gasto em documentação para a construção de versões operativas do produto.
- d) A adoção das mesmas sempre pode implicar em questões culturais, caso a organização use outra abordagem.

30. Assinale a alternativa correta quanto às abordagens ágeis de desenvolvimento:

- a) Elas se aplicam bem a qualquer produto.
- b) Elas sempre garantem entregas mais rápidas de produtos finais.
- c) Elas canalizam o esforço que seria gasto em documentação para a construção de versões operativas do produto.
- d) A adoção das mesmas sempre pode implicar em questões culturais, caso a organização use outra abordagem.**

Aula 2: Questões 16 a 35

Questões 31 a 35

31. O termo "theme" (tema) se relaciona a:

- a) Um conjunto de "user stories" relacionadas.
- b) Um aspecto da visão do projeto, que pode ser contado como uma estória.
- c) Uma "user story" macro, que deve ser desmembrada.
- d) Uma metáfora que ajuda os membros da equipe a entender melhor a visão do projeto.

31. O termo "theme" (tema) se relaciona a:

- a) **Um conjunto de "user stories" relacionadas.**
- b) Um aspecto da visão do projeto, que pode ser contado como uma estória.
- c) Uma "user story" macro, que deve ser desmembrada.
- d) Uma metáfora que ajuda os membros da equipe a entender melhor a visão do projeto.

32. Dos itens seguintes, qual é o mais valorizado pelos times ágeis?

- a) Excelência técnica na solução
- b) Requisitos de negócio detalhadamente documentados
- c) Prazos menores
- d) Investimentos menores

32. Dos itens seguintes, qual é o mais valorizado pelos times ágeis?

- a) Excelência técnica na solução**
- b) Requisitos de negócio detalhadamente documentados
- c) Prazos menores
- d) Investimentos menores

33. Dizer que um processo ágil é incremental significa que:

- a) O conhecimento sobre o negócio é composto ao longo do tempo, durante todo o projeto.
- b) Cada iteração acrescenta um pouco mais de detalhe à documentação do projeto.
- c) O produto do projeto vai crescendo e é entregue aos poucos e ao longo de todo o projeto.
- d) O trabalho é organizado em iterações.

33. Dizer que um processo ágil é incremental significa que:

- a) O conhecimento sobre o negócio é composto ao longo do tempo, durante todo o projeto.
- b) Cada iteração acrescenta um pouco mais de detalhe à documentação do projeto.
- c) O produto do projeto vai crescendo e é entregue aos poucos e ao longo de todo o projeto.**
- d) O trabalho é organizado em iterações.

34. Em uma organização, está sendo discutida a adoção de métodos ágeis em substituição à abordagem "waterfall" para software. Entre as colocações seguintes, indique a que faz mais sentido:

- a) A abordagem "waterfall" permite uma definição precisa de data de entrega final e custo total, mas possui problemas quanto à interação com os usuários
- b) Na abordagem "waterfall", os usuários têm menos oportunidades de interagir uniformemente ao longo do projeto e a previsão de um prazo para o todo é muito difícil
- c) A abordagem "waterfall" tem menos riscos devido ao esforço concentrado em documentação detalhada completa antes de qualquer construção, mas falha nos testes, que ficam somente para o final
- d) A abordagem "waterfall" somente funciona em projetos grandes, sendo muito pesada para projetos menores.

34. Em uma organização, está sendo discutida a adoção de métodos ágeis em substituição à abordagem "waterfall" para software. Entre as colocações seguintes, indique a que faz mais sentido:

- a) A abordagem "waterfall" permite uma definição precisa de data de entrega final e custo total, mas possui problemas quanto à interação com os usuários.
- b) Na abordagem "waterfall", os usuários têm menos oportunidades de interagir uniformemente ao longo do projeto e a previsão de um prazo para o todo é muito difícil.**
- c) A abordagem "waterfall" tem menos riscos devido ao esforço concentrado em documentação detalhada completa antes de qualquer construção, mas falha nos testes, que ficam somente para o final.
- d) A abordagem "waterfall" somente funciona em projetos grandes, sendo muito pesada para projetos menores.

35. "Personas" são:

- a) Usuários finais do produto.
- b) Representantes dos usuários finais do produto.
- c) Personagens fictícias, muitas vezes estereotipadas, que ajudam a entender quem vai lidar com o produto.
- d) "Stakeholders" do projeto com características mais marcantes que podem, por suas pitorescas peculiaridades, trazer desafios à equipe do projeto.

35. "Personas" são:

- a) Usuários finais do produto.
- b) Representantes dos usuários finais do produto.
- c) Personagens fictícias, muitas vezes estereotipadas, que ajudam a entender quem vai lidar com o produto.**
- d) "Stakeholders" do projeto com características mais marcantes que podem, por suas pitorescas peculiaridades, trazer desafios à equipe do projeto.

Aula 3: Questões 36 a 55

Questões 36 a 40

36. No meio de um projeto ágil desenvolvido por um fornecedor externo, o cliente propõe que o contrato seja mudado (para o escopo remanescente) para uma modalidade de preço e prazo fechados. O que pode estar acontecendo?

- a) O cliente deseja transferir para o fornecedor os riscos de custo e prazo.
- b) O cliente já recebeu valor suficiente na forma de produto operativo, de tal forma que o escopo remanescente não é mais tão importante a ponto de ser tratado dentro da abordagem ágil.
- c) O orçamento do cliente provavelmente terminou para o projeto em questão.
- d) O cliente quer cancelar o projeto.

36. No meio de um projeto ágil desenvolvido por um fornecedor externo, o cliente propõe que o contrato seja mudado (para o escopo remanescente) para uma modalidade de preço e prazo fechados. O que pode estar acontecendo?

- a) O cliente deseja transferir para o fornecedor os riscos de custo e prazo.**
- b) O cliente já recebeu valor suficiente na forma de produto operativo, de tal forma que o escopo remanescente não é mais tão importante a ponto de ser tratado dentro da abordagem ágil.
- c) O orçamento do cliente provavelmente terminou para o projeto em questão.
- d) O cliente quer cancelar o projeto.

37. Em um projeto ágil, o melhor lugar para os usuários participantes é:

- a) Junto a Product Owner.
- b) Junto à equipe de desenvolvimento o tempo todo.
- c) Junto à equipe de desenvolvimento nas fases de validação.
- d) A gerência funcional à qual pertencem.

37. Em um projeto ágil, o melhor lugar para os usuários participantes é:

a) Junto a Product Owner.

b) Junto à equipe de desenvolvimento o tempo todo.

c) Junto à equipe de desenvolvimento nas fases de validação.

d) A gerência funcional à qual pertencem.


38. Para um grande “backlog” (com 500 itens), a melhor técnica de estimativa ágil é:

- a) “Scrum de Scrums”
- b) Análise de Pontos de Função
- c) “Ideal time”
- d) “Affinity estimating”

38. Para um grande “backlog” (com 500 itens), a melhor técnica de estimativa ágil é:

- a) “Scrum de Scrums”
- b) Análise de Pontos de Função
- c) “Ideal time”
- d) “Affinity estimating”**

38. Para um grande “backlog” (com 500 itens), a melhor técnica de estimativa ágil é:

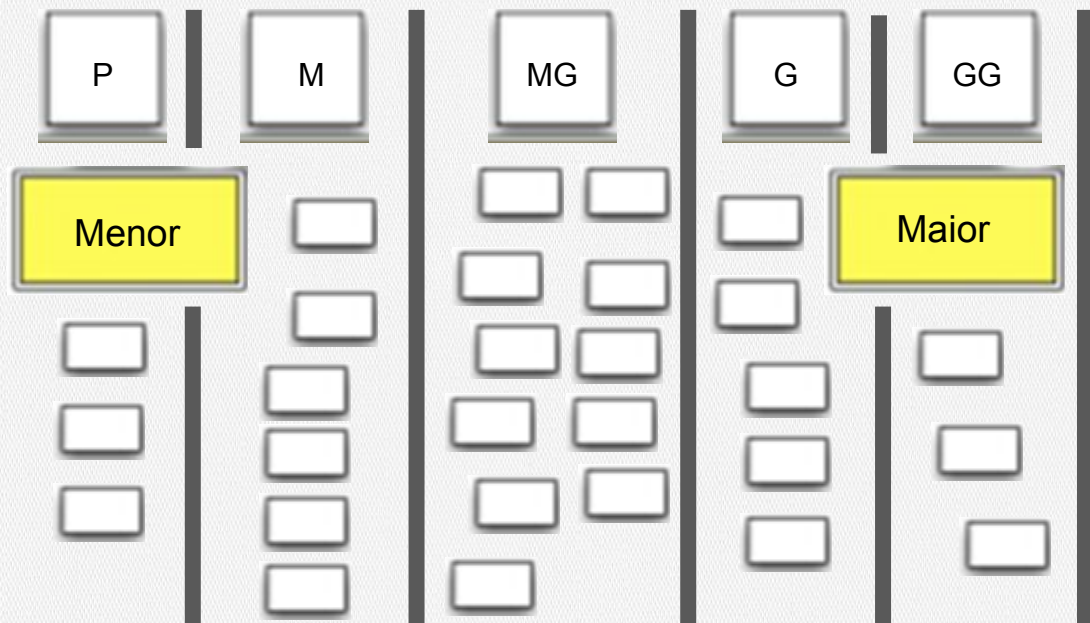

39. O melhor lugar para registrar os impedimentos de um projeto Scrum é:

- a) No “product backlog”
- b) No quadro (“task board”) do Scrum
- c) No material do “status report”
- d) Em “user stories” específicas

39. O melhor lugar para registrar os impedimentos de um projeto Scrum é:

- a) No “product backlog”
- b) No quadro (“task board”) do Scrum**
- c) No material do “status report”
- d) Em “user stories” específicas

40. Um projeto exige dois desembolsos de \$ 100 milhões: um ao final do primeiro mês e outro ao final do segundo mês.

Considerando-se uma taxa de desconto de 2% ao mês, qual a alternativa que mais se aproxima do valor presente destes desembolsos?

- a) \$ 197 milhões
- b) \$ 98 milhões
- c) \$ 194 milhões
- d) \$ 106 milhões

40. Um projeto exige dois desembolsos de \$ 100 milhões: um ao final do primeiro mês e outro ao final do segundo mês.


Considerando-se uma taxa de desconto de 2% ao mês, qual a alternativa que mais se aproxima do valor presente destes desembolsos?

a) \$ 197 milhões

b) \$ 98 milhões

c) \$ 194 milhões

d) \$ 106 milhões

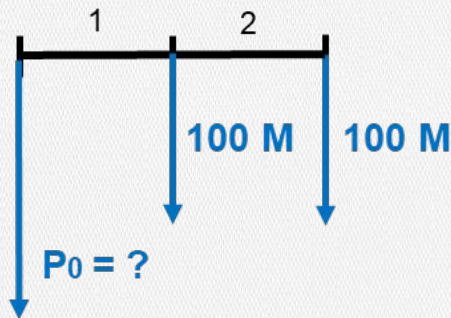

$$P_0 = P_N / (1 + j / 100)^N$$

$$P_0 = 100 / (1,02) + 100 / (1,02)^2 =$$

$$P_0 = 98,04 + 96,12 =$$

$$P_0 = \mathbf{194,16 \text{ M}}$$

Aula 3: Questões 36 a 55

Questões 41 a 45

41. Com relação à técnica de brainstorming, assinale a alternativa incorreta:

- a) As ideias devem antes de mais nada ser geradas livremente.
- b) A técnica exige que todos os participantes sejam especialistas no assunto.
- c) A dinâmica envolvida encoraja o "pensamento fora da caixa".
- d) As ideias geradas devem ser exibidas a todos.

41. Com relação à técnica de brainstorming, assinale a alternativa incorreta:

- a) As ideias devem antes de mais nada ser geradas livremente.
- b) A técnica exige que todos os participantes sejam especialistas no assunto.**
- c) A dinâmica envolvida encoraja o "pensamento fora da caixa".
- d) As ideias geradas devem ser exibidas a todos.

42. Em um projeto ágil, uma iteração tem velocidade de 50 “story points” e duas semanas de duração cada.

O produto completo tem tamanho de 480 “story points”. Assim, o número previsto de iterações e o prazo estimado para conclusão do projeto são, respectivamente:

- a) 9 iterações e 19 semanas
- b) 5 iterações e 10 semanas
- c) 10 iterações e 20 semanas
- d) 5 iterações e 19 semanas

42. Em um projeto ágil, uma iteração tem velocidade de 50 “story points” e duas semanas de duração cada.

O produto completo tem tamanho de 480 “story points”. Assim, o número previsto de iterações e o prazo estimado para conclusão do projeto são, respectivamente:

- a) 9 iterações e 19 semanas
- b) 5 iterações e 10 semanas
- c) 10 iterações e 20 semanas**
- d) 5 iterações e 19 semanas

Número de sprints = $480/50 = 9,6 \Rightarrow 10$ sprints

10 sprints $\Rightarrow$ 20 semanas

43. Qual a função primordial de um "business case"?

- a) Descrever regras de negócio identificando os cenários normais e alternativos, bem como os atores.
- b) Apresentar aspectos da viabilidade de um projeto.
- c) Ilustrar um cenário de negócio através de um caso prático ou exemplar.
- d) Materializar a visão de um projeto.

43. Qual a função primordial de um "business case"?

- a) Descrever regras de negócio identificando os cenários normais e alternativos, bem como os atores.
- b) Apresentar aspectos da viabilidade de um projeto.**
- c) Ilustrar um cenário de negócio através de um caso prático ou exemplar.
- d) Materializar a visão de um projeto.

44. Se um requisito de negócio muda em um projeto Scrum, qual é a melhor medida a ser tomada?

- a) Atualizar o “product backlog”, revisando as prioridades.
- b) Comunicar a equipe de desenvolvimento, para que decida o melhor momento de implementar a mudança sem impactar as metas dos “sprints”.
- c) Elaborar, antes de mais nada, uma “change request” para aprovação por parte do “sponsor” do projeto.
- d) Levar o assunto para a reunião diária imediatamente seguinte, para troca de algum item do “sprint backlog” pela mudança, mantendo o número de “story points” da iteração em curso e a duração da mesma.

44. Se um requisito de negócio muda em um projeto Scrum, qual é a melhor medida a ser tomada?

- a) Atualizar o “product backlog”, revisando as prioridades.**
- b) Comunicar a equipe de desenvolvimento, para que decida o melhor momento de implementar a mudança sem impactar as metas dos “sprints”.
- c) Elaborar, antes de mais nada, uma “change request” para aprovação por parte do “sponsor” do projeto.
- d) Levar o assunto para a reunião diária imediatamente seguinte, para troca de algum item do “sprint backlog” pela mudança, mantendo o número de “story points” da iteração em curso e a duração da mesma.


45. Para que serve um diagrama "spaghetti"?

- a) Para identificar os limites de WIP ("Work In Progress") nos estágios de um sistema de produção.
- b) Para documentar todos os "wastes" da doutrina "lean".
- c) Para servir como um "wireframe" ou protótipo de um produto complexo.
- d) Para enxergar os fluxos em um sistema físico de produção.

45. Para que serve um diagrama "spaghetti"?

- a) Para identificar os limites de WIP ("Work In Progress") nos estágios de um sistema de produção.
- b) Para documentar todos os "wastes" da doutrina "lean".
- c) Para servir como um "wireframe" ou protótipo de um produto complexo.
- d) Para enxergar os fluxos em um sistema físico de produção.**

45. Para que serve um diagrama "spaghetti"?

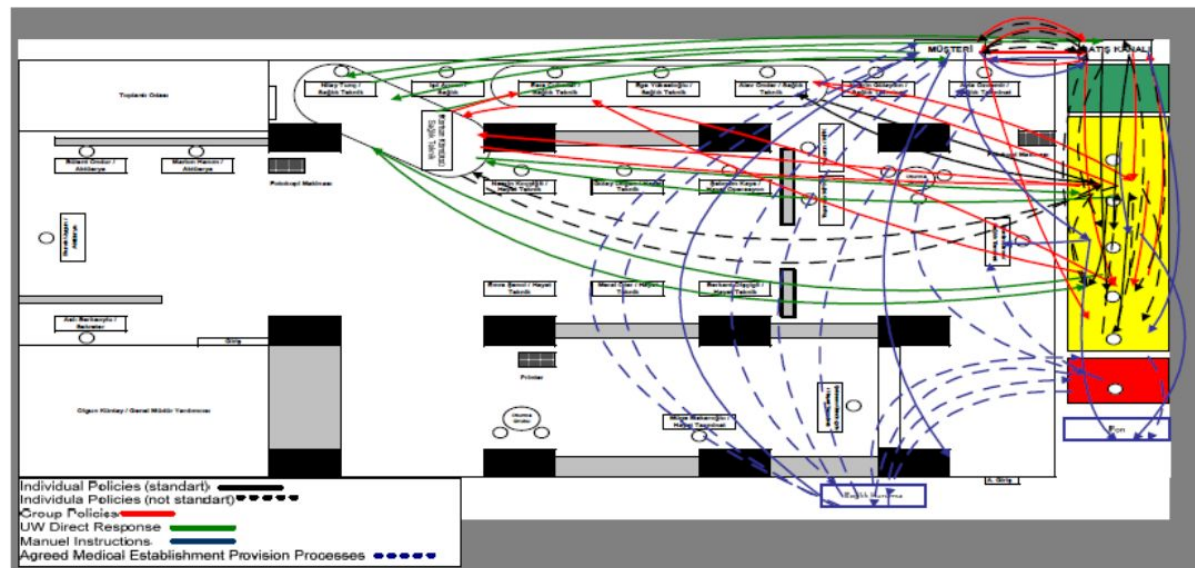

Aula 3: Questões 36 a 55

Questões 46 a 50

46. Qual habilidade é a mais esperada para um Product Owner?

- a) Liderança servidora
- b) Domínio de técnicas de estimativa
- c) Conhecimento do negócio
- d) Domínio do Scrum

46. Qual habilidade é a mais esperada para um Product Owner?

- a) Liderança servidora
- b) Domínio de técnicas de estimativa
- c) Conhecimento do negócio**
- d) Domínio do Scrum

47. Quanto às atribuições de Scrum Master, indique a alternativa correta:

- a) Trata-se de integrante da equipe responsável pela coordenação dos trabalhos, distribuição das tarefas na equipe, facilitação de conflitos e garantia do seguimento do Scrum.
- b) É um(a) líder que ajuda a equipe a resolver problemas e executar as cerimônias.
- c) É gerente do projeto Scrum, que protege a equipe e realiza o planejamento do projeto em conjunto com o Product Owner.
- d) É um(a) especialista que garante que os passos do Scrum estão sendo seguidos e que diariamente avalia o desempenho da equipe.

47. Quanto às atribuições de Scrum Master, indique a alternativa correta:

- a) Trata-se de integrante da equipe responsável pela coordenação dos trabalhos, distribuição das tarefas na equipe, facilitação de conflitos e garantia do seguimento do Scrum.
- b) É um(a) líder que ajuda a equipe a resolver problemas e executar as cerimônias.**
- c) É gerente do projeto Scrum, que protege a equipe e realiza o planejamento do projeto em conjunto com o Product Owner.
- d) É um(a) especialista que garante que os passos do Scrum estão sendo seguidos e que diariamente avalia o desempenho da equipe.

48. O plano de contingência de um risco consiste em:

- a) Um conjunto de ações para diminuir ou a probabilidade ou o impacto do risco.
- b) Ações preventivas.
- c) Um conjunto de ações a serem disparadas somente se o risco se realizar.
- d) Ações para evitar, transferir, mitigar ou aceitar um risco.

48. O plano de contingência de um risco consiste em:

- a) Um conjunto de ações para diminuir ou a probabilidade ou o impacto do risco.
- b) Ações preventivas.
- c) Um conjunto de ações a serem disparadas somente se o risco se realizar.**
- d) Ações para evitar, transferir, mitigar ou aceitar um risco.

49. A chamada visão de um projeto ágil:

- a) É o seu escopo detalhado.
- b) Tem um caráter de sonho e desafio.
- c) Explicita o ganho financeiro do projeto.
- d) É obtida na medida em que o projeto avança.

49. A chamada visão de um projeto ágil:

- a) É o seu escopo detalhado.
- b) Tem um caráter de sonho e desafio.**
- c) Explicita o ganho financeiro do projeto.
- d) É obtida na medida em que o projeto avança.

50. O nível mais alto do “story mapping” (seu “backbone”) é composto por fichas que representam:

- a) “Themes”
- b) “Epics”
- c) Tarefas
- d) A visão do projeto

50. O nível mais alto do “story mapping” (seu “backbone”) é composto por fichas que representam:


a) “Themes”

b) “Epics”

c) Tarefas

d) A visão do projeto

50. O nível mais alto do “story mapping” (seu “backbone”) é composto por fichas que representam:

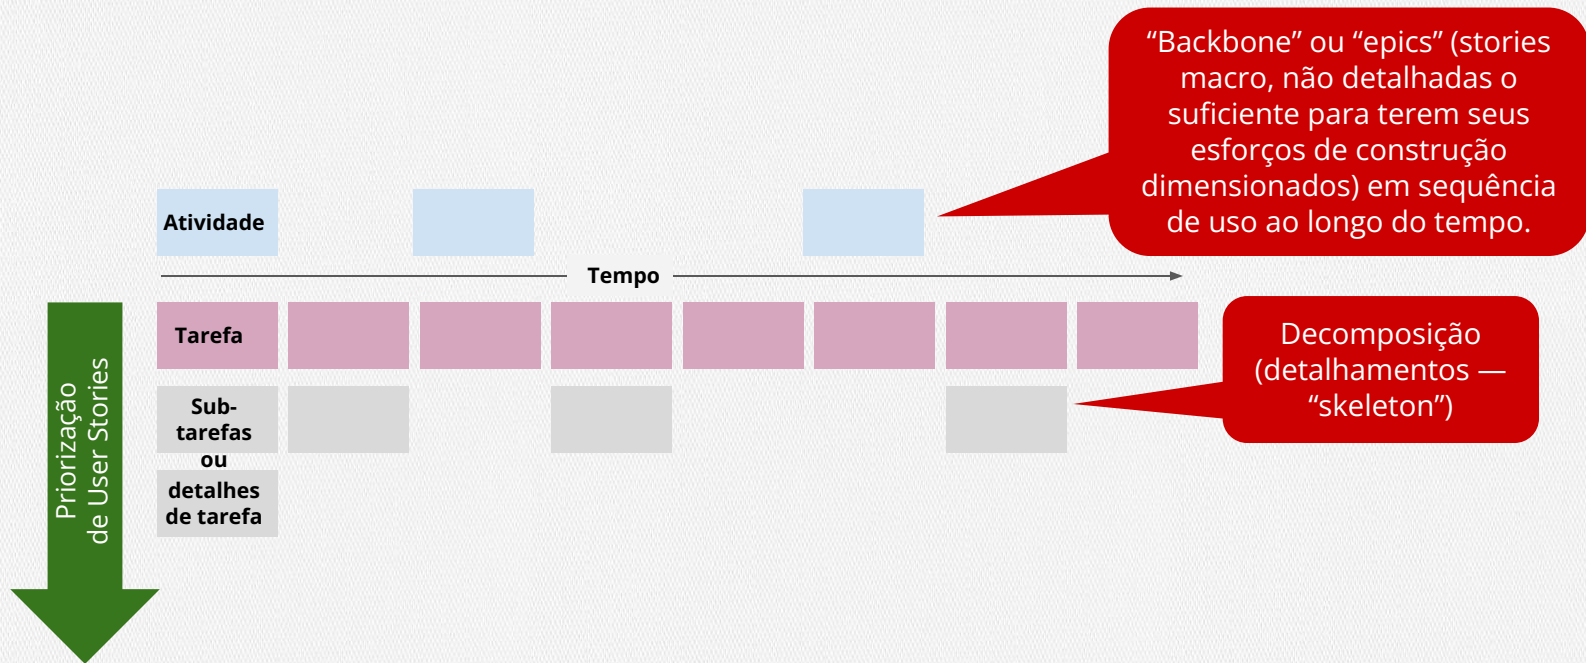

Aula 3: Questões 36 a 55

Questões 51 a 55

51. Em uma sessão de “planning poker”, quando um membro da equipe não tem ideia de qual seria uma estimativa para o tamanho de uma “user story”, o que é melhor ele fazer?

- a) Comunicar que não sabe dar a estimativa.
- b) Dar uma estimativa alta, por segurança.
- c) Informar que ele não poderá ser a pessoa que vai realizar a construção relativa à “user story”.
- d) Dar uma estimativa que corresponde à média das demais.

51. Em uma sessão de “planning poker”, quando um membro da equipe não tem ideia de qual seria uma estimativa para o tamanho de uma “user story”, o que é melhor ele fazer?

- a) Comunicar que não sabe dar a estimativa.**
- b) Dar uma estimativa alta, por segurança.
- c) Informar que ele não poderá ser a pessoa que vai realizar a construção relativa à “user story”.
- d) Dar uma estimativa que corresponde à média das demais.

52. O que é a chamada "sprint signature"?

- a) Um termo de compromisso com as metas de um "sprint".
- b) O aspecto do desenrolar dos trabalhos em um "sprint".
- c) O aceite formal dos produtos de um "sprint".
- d) A autorização para um "sprint" começar.

52. O que é a chamada "sprint signature"?

- a) Um termo de compromisso com as metas de um "sprint".
- b) O aspecto do desenrolar dos trabalhos em um "sprint".**
- c) O aceite formal dos produtos de um "sprint".
- d) A autorização para um "sprint" começar.

53. Em uma equipe ágil co-locada (todos no mesmo espaço físico), um membro tinha o apelido de "guru" e era a referência local para sanar complexas dúvidas de arquitetura e "user interface design".

A inserção desta pessoa no grupo consistiu na adoção da técnica de:

- a) "Expert in earshot"
- b) "Shared Resources Teams"
- c) "Wide Band Delphi"
- d) "Extreme Programming"

53. Em uma equipe ágil co-locada (todos no mesmo espaço físico), um membro tinha o apelido de "guru" e era a referência local para sanar complexas dúvidas de arquitetura e "user interface design".

A inserção desta pessoa no grupo consistiu na adoção da técnica de:

- a) "Expert in earshot"**
- b) "Shared Resources Teams"
- c) "Wide Band Delphi"
- d) "Extreme Programming"

54. A garantia de que um produto desenvolvido de forma incremental e sujeito a alterações constantes não vai sair de controle é conferida por uma robusta:

- a) Autogestão
- b) Gestão do escopo
- c) Gestão centralizada
- d) Gestão da configuração

54. A garantia de que um produto desenvolvido de forma incremental e sujeito a alterações constantes não vai sair de controle é conferida por uma robusta:

- a) Autogestão
- b) Gestão do escopo
- c) Gestão centralizada
- d) Gestão da configuração**

55. Um projeto ágil é “guiado” fundamentalmente por:

- a) Escopo, o orçamento e o tempo
- b) Conjunto de riscos identificados para o projeto
- c) Plano do projeto
- d) Visão e valor

55. Um projeto ágil é “guiado” fundamentalmente por:

- a) Escopo, o orçamento e o tempo
- b) Conjunto de riscos identificados para o projeto
- c) Plano do projeto
- d) Visão e valor**

Aula 4: Questões 56 a 75

Questões 56 a 60

56. Um número elevado de "escaped defects" em um projeto pode indicar que:

- a) As verificações e validações precisam melhorar.
- b) Há muita mudança no conjunto de requisitos do projeto.
- c) A equipe está ociosa.
- d) Os testes para detecção de falhas internas estão com critérios muito rigorosos.

56. Um número elevado de "escaped defects" em um projeto pode indicar que:

- a) As verificações e validações precisam melhorar.**
- b) Há muita mudança no conjunto de requisitos do projeto.
- c) A equipe está ociosa.
- d) Os testes para detecção de falhas internas estão com critérios muito rigorosos.

57. A melhor forma de tornar mais produtivo um sistema de produção é:

- a) Colocar mais pessoas trabalhando no ponto do gargalo, com consecutivo aumento do WIP ("Work In Progress").
- b) Repensar o processo de produção.
- c) Automatizar o sistema de produção.
- d) Instituir um esquema de trabalho incremental e iterativo.

57. A melhor forma de tornar mais produtivo um sistema de produção é:

- a) Colocar mais pessoas trabalhando no ponto do gargalo, com consecutivo aumento do WIP ("work in progress").
- b) Repensar o processo de produção.**
- c) Automatizar o sistema de produção.
- d) Instituir um esquema de trabalho incremental e iterativo.

58. Uma pessoa fica espantada ao saber que o Scrum não utiliza cronograma, querendo saber como ficam as datas limites legais. O que você argumentaria para esta pessoa?

- a) O atendimento de uma data legal pode perfeitamente entrar como um item do “product backlog” a ser priorizado para os primeiros “sprints”.
- b) O atendimento de uma data legal em um projeto Scrum pode ser endereçado como um ponto fundamental da visão do projeto, de tal forma que o planejamento dos “sprints” deva ser norteado por esta meta.
- c) Como em um projeto ágil é impossível estimar a data final, neste caso específico de limite de data legal seria melhor utilizar uma abordagem “waterfall”.
- d) Nas primeiras iterações, podemos trabalhar para gerar um produto parcial que já atenda a data legal.

58. Uma pessoa fica espantada ao saber que o Scrum não utiliza cronograma, querendo saber como ficam as datas limites legais. O que você argumentaria para esta pessoa?

- a) O atendimento de uma data legal pode perfeitamente entrar como um item do “product backlog” a ser priorizado para os primeiros “sprints”.
- b) O atendimento de uma data legal em um projeto Scrum pode ser endereçado como um ponto fundamental da visão do projeto, de tal forma que o planejamento dos “sprints” deva ser norteado por esta meta.**
- c) Como em um projeto ágil é impossível estimar a data final, neste caso específico de limite de data legal seria melhor utilizar uma abordagem “waterfall”.
- d) Nas primeiras iterações, podemos trabalhar para gerar um produto parcial que já atenda a data legal.

- 59. Um produto está sendo desenvolvido ao longo de 5 meses. Ao final do mês 4, estava previsto 90% de completeza das entregas em termos de valor agregado, mas somente 70% foi entregue. Ainda ao final deste mês 4, 100% do orçamento já foi consumido. Nestas condições, se o valor total do produto é de \$1.000.000,00, é incorreto afirmar que:**
- a) Com certeza absoluta o projeto está atrasado neste momento.
 - b) PV ("Planned Value") = 900.000,00, EV ("Earned Value") = 700.000,00 e AC ("Actual Cost") = 1.000.000,00.
 - c) A produtividade do investimento deste projeto está boa.
 - d) O projeto não pode ser considerado concluído ainda.

59. Um produto está sendo desenvolvido ao longo de 5 meses. Ao final do mês 4, estava **previsto 90% de completude das entregas em termos de valor agregado**, mas somente **70% foi entregue**. Ainda ao final deste mês 4, 100% do orçamento já foi consumido. Nestas condições, se o **valor total do produto é de \$1.000.000,00**, é **incorreto** afirmar que:

PV ("Planned Value") = 900.000,00

EV ("Earned Value") = 700.000,00

AC ("Actual Cost") = 1.000.000,00

SPI ("Schedule Performance Index")

CPI ("Cost Performance Index")

$SPI = EV / PV = 700k / 900k = 0,78$

$CPI = EV / AC = 700k / 1.000k = 0,70$

Projeto atrasado.

Acima do orçamento.

59. Um produto está sendo desenvolvido ao longo de 5 meses. Ao final do mês 4, estava previsto 90% de completeza das entregas em termos de valor agregado, mas somente 70% foi entregue. Ainda ao final deste mês 4, 100% do orçamento já foi consumido.
- Nestas condições, se o valor total do produto é de \$1.000.000,00, é incorreto afirmar que:
- a) Com certeza absoluta o projeto está atrasado neste momento.
 - b) PV ("Planned Value") = 900.000,00, EV ("Earned Value") = 700.000,00 e AC ("Actual Cost") = 1.000.000,00.
 - c) A produtividade do investimento deste projeto está boa.**
 - d) O projeto não pode ser considerado concluído ainda.

60. A Gestão Ágil de projetos é adequada:

- a) Para qualquer tipo de projeto.
- b) Para projetos pequenos.
- c) Para projetos onde o cenário é muito mutável ou o escopo não se encontra bem cristalizado.
- d) Para projetos que envolvem produtos simples.

60. A Gestão Ágil de projetos é adequada:

- a) Para qualquer tipo de projeto.
- b) Para projetos pequenos.
- c) Para projetos onde o cenário é muito mutável ou o escopo não se encontra bem cristalizado.**
- d) Para projetos que envolvem produtos simples.

Aula 4: Questões 56 a 75

Questões 61 a 65

61. Qual a finalidade da adoção de uma "done definition" em um projeto ágil?

- a) Caracterizar o estado de um produto ou subproduto que será entregue para validação ao final de uma iteração.
- b) Saber exatamente quando uma iteração pode terminar.
- c) Saber exatamente quando não são necessárias mais iterações, em virtude do atingimento da visão.
- d) Evitar mudanças de escopo.

61. Qual a finalidade da adoção de uma "done definition" em um projeto ágil?

- a) **Caracterizar o estado de um produto ou subproduto que será entregue para validação ao final de uma iteração.**
- b) Saber exatamente quando uma iteração pode terminar.
- c) Saber exatamente quando não são necessárias mais iterações, em virtude do atingimento da visão.
- d) Evitar mudanças de escopo.

62. A sustentabilidade expressa nos corolários do Manifesto Ágil:

- a) Convoca os postulantes a terem uma visão que balanceie meio ambiente, pessoas e retorno financeiro.
- b) Traz a ideia de regularidade e razoabilidade no emprego de esforços.
- c) Valoriza as relações de longo prazo baseadas na confiança.
- d) Defende a ideia da construção de produtos perenes, de máximo valor e fácil manutenção.

62. A sustentabilidade expressa nos corolários do Manifesto Ágil:

- a) Convoca os postulantes a terem uma visão que balanceie meio ambiente, pessoas e retorno financeiro.
- b) Traz a ideia de regularidade e razoabilidade no emprego de esforços.**
- c) Valoriza as relações de longo prazo baseadas na confiança.
- d) Defende a ideia da construção de produtos perenes, de máximo valor e fácil manutenção.

63. Uma equipe adotou o Kanban e passou a manter um diagrama de fluxo cumulativo, a partir do qual começou a perceber que a linha de "dones" está subindo mais acentuadamente que a linha de itens a iniciar ("backlog").

Se esta tendência se mantiver, é correto afirmar que:

- a) Está sendo adicionado ao sistema de produção mais trabalho do que ele pode entregar.
- b) O lead time está aumentando, o que pode ser sinal de gargalos.
- c) Há com certeza um gargalo no sistema de produção.
- d) O sistema de produção está com capacidade que atende bem ao volume demandado.

63. Uma equipe adotou o Kanban e passou a manter um diagrama de fluxo cumulativo, a partir do qual começou a perceber que a linha de "dones" está subindo mais acentuadamente que a linha de itens a iniciar ("backlog").

Se esta tendência se mantiver, é correto afirmar que:

- a) Está sendo adicionado ao sistema de produção mais trabalho do que ele pode entregar.
- b) O lead time está aumentando, o que pode ser sinal de gargalos.
- c) Há com certeza um gargalo no sistema de produção.
- d) O sistema de produção está com capacidade que atende bem ao volume demandado.**

64. Assinale a alternativa correta quanto à fase inicial de um projeto ágil (definição da visão / "release planning"):

- a) Não são feitas estimativas de prazo e custo do projeto todo.
- b) As primeiras user stories são detalhadas.
- c) O escopo é detalhado para que o projeto possa começar.
- d) Os impedimentos do projeto são todos identificados.

64. Assinale a alternativa correta quanto à fase inicial de um projeto ágil (definição da visão / "release planning"):

- a) Não são feitas estimativas de prazo e custo do projeto todo.**
- b) A versão inicial do "product backlog" é elaborada.
- c) O escopo é detalhado para que o projeto possa começar.
- d) Os impedimentos do projeto são todos identificados.

65. Um processo interativo significa que:

- a) O produto cresce aos poucos, em entregas espaçadas por espaços de tempo relativamente curtos.
- b) O controle do projeto se baseia em inspeção e constante correção de rumo.
- c) Usuários e construtores estão em contato constante, com intensa comunicação.
- d) Nenhuma das anteriores.

65. Um processo iterativo significa que:

- a) O produto cresce aos poucos, em entregas espaçadas por espaços de tempo relativamente curtos.
- b) O controle do projeto se baseia em inspeção e constante correção de rumo.
- c) Usuários e construtores estão em contato constante, com intensa comunicação.**
- d) Nenhuma das anteriores.

Aula 4: Questões 56 a 75

Questões 66 a 70

66. O que significa "earned value" na Análise de Valor Agregado?

- a) Quanto já foi investido até o momento no projeto.
- b) Quanto se esperava no momento de valor oriundo de entregas completadas no projeto.
- c) Valor do produto do projeto pronto no momento.
- d) Retorno financeiro do projeto no momento.

66. O que significa "earned value" na Análise de Valor Agregado?

- a) Quanto já foi investido até o momento no projeto.
- b) Quanto se esperava no momento de valor oriundo de entregas completadas no projeto.
- c) Valor do produto do projeto pronto no momento.**
- d) Retorno financeiro do projeto no momento.

67. É explicado ao patrocinador de um projeto de software que nas abordagens ágeis há entrega de software rodando a cada iteração. O patrocinador argumenta que deseja receber o software somente quando ele estiver totalmente pronto. Diante disto, o que você argumentaria?

- a) Você proporia ao patrocinador o uso de uma abordagem "waterfall".
- b) Você falaria da antecipação de problemas de integração e da importância do feedback para entender as reais necessidades.
- c) Você argumentaria que entregas muito grandes carregam muitos defeitos.
- d) Você pediria um escopo detalhado do produto para realizar algumas análises e então trazer uma nova alternativa de abordagem para o projeto.

67. É explicado ao patrocinador de um projeto de software que nas abordagens ágeis há entrega de software rodando a cada iteração. O patrocinador argumenta que deseja receber o software somente quando ele estiver totalmente pronto. Diante disto, o que você argumentaria?

- a) Você proporia ao patrocinador o uso de uma abordagem "waterfall".
- b) Você falaria da antecipação de problemas de integração e da importância do feedback para entender as reais necessidades.**
- c) Você argumentaria que entregas muito grandes carregam muitos defeitos.
- d) Você pediria um escopo detalhado do produto para realizar algumas análises e então trazer uma nova alternativa de abordagem para o projeto.

68. Uma equipe ágil de desenvolvimento de software está discutindo se vale ou não a pena produzir documentos de especificação técnica para o projeto, em complemento às “user stories”. Quanto a esta discussão, o que é mais correto afirmar à luz da doutrina ágil?

- a) Não é necessário consumir tempo em mais documentação se as "user stories" estiverem bem entendidas.
- b) Os documentos devem ser produzidos se houver tempo nas iterações, pois a prioridade é a codificação de software operativo.
- c) Os membros da equipe devem se entender e decidir se produzem mais documentos de suporte à construção ou não.
- d) Scrum Master deve decidir a questão.

68. Uma equipe ágil de desenvolvimento de software está discutindo se vale ou não a pena produzir documentos de especificação técnica para o projeto, em complemento às “user stories”. Quanto a esta discussão, o que é mais correto afirmar à luz da doutrina ágil?

- a) Não é necessário consumir tempo em mais documentação se as "user stories" estiverem bem entendidas.
- b) Os documentos devem ser produzidos se houver tempo nas iterações, pois a prioridade é a codificação de software operativo.
- c) Os membros da equipe devem se entender e decidir se produzem mais documentos de suporte à construção ou não.**
- d) Scrum Master deve decidir a questão.

69. Quais assuntos são tratados nas reuniões diárias do Scrum?

- a) O que foi feito ontem, o que está sendo feito hoje e o que será feito amanhã.
- b) O que foi feito ontem, o que será feito hoje e quais os pontos que estão atrapalhando o trabalho.
- c) O que foi feito desde a última reunião, “feedback” à equipe, plano para o período seguinte e que impedimentos existem sem solução.
- d) O que foi completado até o dia de hoje, o que será completado hoje e o que pode ser melhorado.

69. Quais assuntos são tratados nas reuniões diárias do Scrum?

- a) O que foi feito ontem, o que está sendo feito hoje e o que será feito amanhã.
- b) O que foi feito ontem, o que será feito hoje e quais os pontos que estão atrapalhando o trabalho.**
- c) O que foi feito desde a última reunião, “feedback” à equipe, plano para o período seguinte e que impedimentos existem sem solução.
- d) O que foi completado até o dia de hoje, o que será completado hoje e o que pode ser melhorado.

70. Qual atribuição de gerente de projetos das abordagens de gestão ditas tradicionais não condiz com os preceitos ágeis?

- a) Planejamento.
- b) Designação de tarefas.
- c) Resolução de problemas.
- d) Proteção à equipe.

70. Qual atribuição de gerente de projetos das abordagens de gestão ditas tradicionais não condiz com os preceitos ágeis?

- a) Planejamento.
- b) Designação de tarefas.**
- c) Resolução de problemas.
- d) Proteção à equipe.

Aula 4: Questões 56 a 75

Questões 71 a 75

71. O Kanban pode ser entendido como um sistema:

- a) De prevenção de defeitos e outros tipos de desperdícios.
- b) De geração de indicadores de desperdícios.
- c) De medição da qualidade e da produtividade da produção.
- d) De comunicação e controle da produção.

71. O Kanban pode ser entendido como um sistema:

- a) De prevenção de defeitos e outros tipos de desperdícios.
- b) De geração de indicadores de desperdícios.
- c) De medição da qualidade e da produtividade da produção.
- d) De comunicação e controle da produção.**

72. Em um projeto desenvolvido com ciclo de vida "waterfall", a equipe está com dificuldades enormes em fazer o produto todo funcionar. A data de entrega final já foi excedida e as pressões estão grandes.

Qual elemento das abordagens ágeis teria contribuído mais diretamente para evitar este problema?

- a) "Sustainable pace" (cadência sustentável).
- b) Autogestão da equipe.
- c) Retrospectivas.
- d) Integração contínua.

72. Em um projeto desenvolvido com ciclo de vida "waterfall", a equipe está com dificuldades enormes em fazer o produto todo funcionar. A data de entrega final já foi excedida e as pressões estão grandes.

Qual elemento das abordagens ágeis teria contribuído mais diretamente para evitar este problema?

- a) "Sustainable pace" (cadência sustentável).
- b) Autogestão da equipe.
- c) Retrospectivas.
- d) Integração contínua.**

73. Entre as técnicas que podem ser usadas no "active listening", qual não é válida?

- a) Repetir o que está sendo ouvido, com outras palavras.
- b) Solicitar formalização a quem está falando, após a conversa.
- c) Balançar a cabeça, demonstrando entendimento do que está sendo dito.
- d) Ouvir atentamente e demonstrar empatia.

73. Entre as técnicas que podem ser usadas no "active listening", qual não é válida?

- a) Repetir o que está sendo ouvido, com outras palavras.
- b) Solicitar formalização a quem está falando, após a conversa.**
- c) Balançar a cabeça, demonstrando entendimento do que está sendo dito.
- d) Ouvir atentamente e demonstrar empatia.

74. O gráfico de "release burndown" permite à equipe:

- a) Ver a evolução do projeto como um todo.
- b) Ver os avanços do trabalho de uma iteração.
- c) Ver quantos itens do "product backlog" faltam para que o projeto seja encerrado.
- d) Ver a data final do projeto.

74. O gráfico de "release burndown" permite à equipe:

- a) **Ver a evolução do projeto como um todo.**
- b) Ver os avanços do trabalho de uma iteração.
- c) Ver quantos itens do "product backlog" faltam para que o projeto seja encerrado.
- d) Ver a data final do projeto.

75. Qual dos seguintes componentes não faz parte de um “release planning”?

- a) Visão do projeto.
- b) Estimativa preliminar do número de iterações e da duração de cada uma.
- c) Lista preliminar de riscos.
- d) Especificações funcionais do projeto.

75. Qual dos seguintes componentes não faz parte de um “release planning”?

- a) Visão do projeto.
- b) Estimativa preliminar do número de iterações e da duração de cada uma.
- c) Lista preliminar de riscos.
- d) Especificações funcionais do projeto.**

Aula 5: Questões 76 a 90

Questões 76 a 80

76. Qual das abordagens seguintes é a mais prescritiva?

- a) Desenvolvimento "cowboy"
- b) Scrum
- c) RUP ("Rational Unified Process")
- d) Kanban

76. Qual das abordagens seguintes é a mais prescritiva?

- a) Desenvolvimento "cowboy"
- b) Scrum
- c) RUP ("Rational Unified Process")**
- d) Kanban

77. Uma tarefa do tipo "testar o módulo XYZ" é típica de qual artefato?

- a) "Product backlog"
- b) "Sprint backlog"
- c) "Burndown chart"
- d) "Release plan" (documento de visão)

77. Uma tarefa do tipo "testar o módulo XYZ" é típica de qual artefato?

- a) "Product backlog"
- b) "Sprint backlog"**
- c) "Burndown chart"
- d) "Release plan" (documento de visão)

78. Em um determinado momento no tempo, o EV ("Earned Value") de um projeto está maior que o PV ("Planned Value").

Nesta condição, podemos dizer que:

- a) O projeto está bem financeiramente.
- b) O projeto precisa de mais pessoas na equipe para se recuperar.
- c) Se a tendência se mantiver, o projeto será concluído após o prazo previsto.
- d) O projeto está adiantado.

78. Em um determinado momento no tempo, o EV ("Earned Value") de um projeto está maior que o PV ("Planned Value").

Nesta condição, podemos dizer que:

- a) O projeto está bem financeiramente.
- b) O projeto precisa de mais pessoas na equipe para se recuperar.
- c) Se a tendência se mantiver, o projeto será concluído após o prazo previsto.
- d) O projeto está adiantado.**

79. Uma equipe ágil atingiu todas as metas de um determinado “sprint” na metade do tempo previsto. O que seria melhor fazer neste caso?

- a) Usar o tempo restante para testar mais o produto.
- b) Descansar.
- c) Incluir mais itens no “sprint”.
- d) Mudar a duração dos “sprints” futuros.

79. Uma equipe ágil atingiu todas as metas de um determinado “sprint” na metade do tempo previsto. O que seria melhor fazer neste caso?

- a) Usar o tempo restante para testar mais o produto.
- b) Descansar.
- c) Incluir mais itens no “sprint”.**
- d) Mudar a duração dos “sprints” futuros.

80. Qual o critério básico que deve ser usado na priorização de um “product backlog”?

- a) Facilidade de construção.
- b) Valor para o negócio.
- c) Consenso da equipe.
- d) Aspectos técnicos de implementação.

80. Qual o critério básico que deve ser usado na priorização de um “product backlog”?

- a) Facilidade de construção.
- b) Valor para o negócio.**
- c) Consenso da equipe.
- d) Aspectos técnicos de implementação.

Aula 5: Questões 76 a 90

Questões 81 a 85

81. Ao analisar a viabilidade de um projeto, a equipe é informada pela direção de que uma taxa de atratividade mínima para a organização seria de 1% ao mês. Nestas circunstâncias, vale dizer que:

- a) Se a taxa que zera o valor presente líquido do projeto for maior que 1%, isto é um indicativo de viabilidade, na organização em questão.
- b) É melhor aplicar o dinheiro em projetos, pois dificilmente a organização vai conseguir 1% de rendimento líquido mensal no mercado financeiro.
- c) Se o valor presente líquido do projeto for positivo, então o projeto é viável.
- d) O projeto deve ser realizado somente se envolver alguma obrigação legal, pois com certeza será financeiramente desvantajoso.

81. Ao analisar a viabilidade de um projeto, a equipe é informada pela direção de que uma taxa de atratividade mínima para a organização seria de 1% ao mês. Nestas circunstâncias, vale dizer que:

- a) Se a taxa que zera o valor presente líquido do projeto for maior que 1%, isto é um indicativo de viabilidade, na organização em questão.**
- b) É melhor aplicar o dinheiro em projetos, pois dificilmente a organização vai conseguir 1% de rendimento líquido mensal no mercado financeiro.
- c) Se o valor presente líquido do projeto for positivo, então o projeto é viável.
- d) O projeto deve ser realizado somente se envolver alguma obrigação legal, pois com certeza será financeiramente desvantajoso.

82. Em um gráfico de “burndown”, as curvas de previsto e realizado andaram praticamente juntas mas, no penúltimo dia da iteração, a curva do realizado cai bruscamente a zero. Diante disto, o que seria mais descabido afirmar?

- a) A equipe estimou muito bem o trabalho da iteração, mas no penúltimo dia houve um imprevisto que causou um atraso.
- b) De uma maneira geral, a equipe superestimou um pouco os esforços.
- c) Um pouco mais de “story points” poderiam ter sido adicionados à carga do “sprint”.
- d) Nenhum item do “sprint backlog” ficou sem tratativa pela equipe.

82. Em um gráfico de “burndown”, as curvas de previsto e realizado andaram praticamente juntas mas, no penúltimo dia da iteração, a curva do realizado cai bruscamente a zero. Diante disto, o que seria mais descabido afirmar?
- a) **A equipe estimou muito bem o trabalho da iteração, mas no penúltimo dia houve um imprevisto que causou um atraso.**
 - b) De uma maneira geral, a equipe superestimou um pouco os esforços.
 - c) Um pouco mais de “story points” poderiam ter sido adicionados à carga do “sprint”.
 - d) Nenhum item do “sprint backlog” ficou sem tratativa pela equipe.

83. A realização de reuniões diárias em pé tem como objetivo:

- a) Reforçar o valor da visibilidade.
- b) Fazer com que a reunião não se estenda.
- c) Contribuir para a saúde dos participantes, que costumam ficar a maior parte do dia sentados.
- d) Dar tom solene ao evento.

83. A realização de reuniões diárias em pé tem como objetivo:

- a) Reforçar o valor da visibilidade.
- b) Fazer com que a reunião não se estenda.**
- c) Contribuir para a saúde dos participantes, que costumam ficar a maior parte do dia sentados.
- d) Dar tom solene ao evento.

84. Aproxima-se mais de um processo empírico:

- a) Processo de fábrica de software.
- b) Projeto de uma aeronave.
- c) Pesquisa da cura de uma doença.
- d) Metodologia baseada no PMBOK.

84. Aproxima-se mais de um processo empírico:

- a) Processo de fábrica de software.
- b) Projeto de uma aeronave.
- c) Pesquisa da cura de uma doença.**
- d) Metodologia baseada no PMBOK.

85. Indique a alternativa que expressa exatamente uma declaração do Manifesto Ágil:

- a) Valorizamos mais responder às mudanças do que negociação de contratos.
- b) Valorizamos mais colaboração com o cliente do que seguir um plano.
- c) Valorizamos mais software em funcionamento do que processos e ferramentas.
- d) Valorizamos mais indivíduos e interação entre eles do que processos e ferramentas.

85. Indique a alternativa que expressa exatamente uma declaração do Manifesto Ágil:

- a) Valorizamos mais responder às mudanças do que negociação de contratos.
- b) Valorizamos mais colaboração com o cliente do que seguir um plano.
- c) Valorizamos mais software em funcionamento do que processos e ferramentas.
- d) Valorizamos mais indivíduos e interação entre eles do que processos e ferramentas.**

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar:

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
Software em funcionamento mais que documentação abrangente
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
Responder a mudanças mais que seguir um plano

Aula 5: Questões 76 a 90

Questões 86 a 90

86. A forma de comunicação mais valorizada pelas abordagens ágeis é:

- a) A informal por escrito.
- b) A cara a cara.
- c) A expressa em “user stories”.
- d) A alinhada com a visão do projeto.

86. A forma de comunicação mais valorizada pelas abordagens ágeis é:

- a) A informal por escrito.
- b) A cara a cara.**
- c) A expressa em “user stories”.
- d) A alinhada com a visão do projeto.

87. Um fator de sucesso em um projeto ágil é:

- a) O planejamento detalhado e o comprometimento dos usuários com o plano.
- b) A liberdade conferida pela não necessidade de seguir um escopo rígido nos sprints.
- c) A excelência técnica da equipe auto-organizada.
- d) O alto nível de prescrição da metodologia.

87. Um fator de sucesso em um projeto ágil é:

- a) O planejamento detalhado e o comprometimento dos usuários com o plano.
- b) A liberdade conferida pela não necessidade de seguir um escopo rígido nos sprints.
- c) A excelência técnica da equipe auto-organizada.**
- d) O alto nível de prescrição da metodologia.

88. Qual dos seguintes fatores mais pode prejudicar um projeto ágil?

- a) Falta de recursos.
- b) Ciclos (iterações) curtos e em grande quantidade.
- c) Mudança constante de requisitos.
- d) Requisitos de negócio muito complexos.

88. Qual dos seguintes fatores mais pode prejudicar um projeto ágil?

- a) Falta de recursos.**
- b) Ciclos (iterações) curtos e em grande quantidade.
- c) Mudança constante de requisitos.
- d) Requisitos de negócio muito complexos.


89. Um item do tipo "delighter" (atrativo extra), no modelo de Kano:

- a) Precisa ser implementado com máxima completeza para causar encantamento no cliente.
- b) Causa enorme frustração se for fracamente implementado.
- c) Possui elevado poder de trazer satisfação aos clientes.
- d) Não exige muito esforço de implementação e é bem apreciado pelos clientes.

89. Um item do tipo "delighter" (atrativo extra), no modelo de Kano:

- a) Precisa ser implementado com máxima completeza para causar encantamento no cliente.
- b) Causa enorme frustração se for fracamente implementado.
- c) Possui elevado poder de trazer satisfação aos clientes.**
- d) Não exige muito esforço de implementação e é bem apreciado pelos clientes.

89. Um item do tipo "delighter" (atrativo extra), no modelo de Kano:

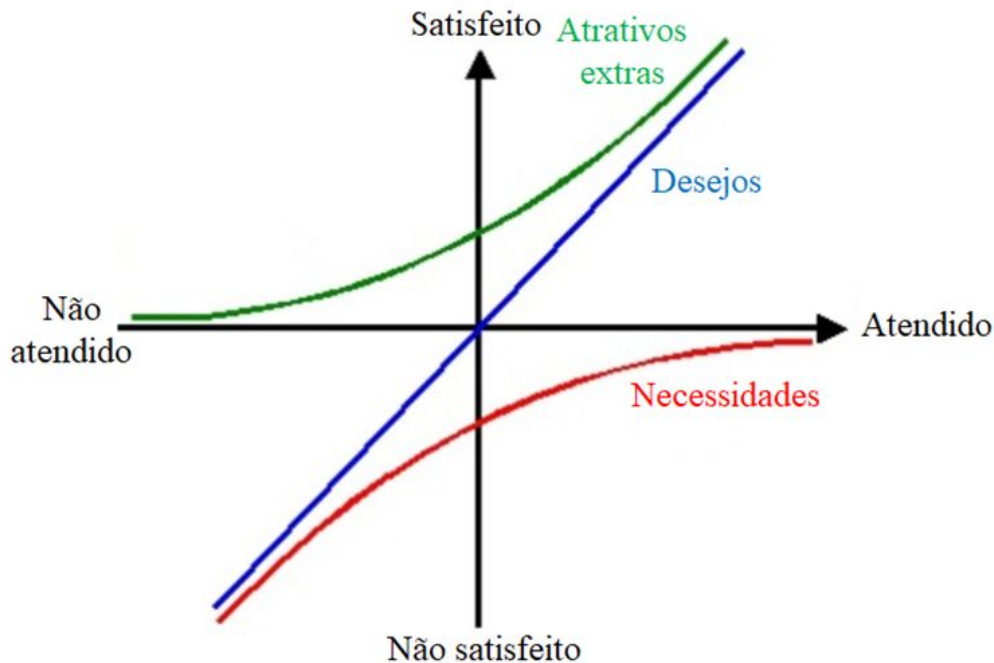

Atrativos extras ("delighters")

- Se não forem atendidos: **não há punição.**
- Se forem atendidos: **aumento exponencial da satisfação.**

90. O que significa "ideal time" nas estimativas de tempo de projetos?

- a) Tempo otimista demais, pois considera trabalho que agrega valor puro e simples, sem lembrar que existem idas ao banheiro, interrupções, momentos de dispersão etc.
- b) Tempo próximo do padrão para uma determinada atividade, com base no conhecimento histórico.
- c) Tempo para realização de um "user story point".
- d) Tempo de atravessamento ("lead time").

90. O que significa "ideal time" nas estimativas de tempo de projetos?

- a) **Tempo otimista demais, pois considera trabalho que agrega valor puro e simples, sem lembrar que existem idas ao banheiro, interrupções, momentos de dispersão etc.**
- b) Tempo próximo do padrão para uma determinada atividade, com base no conhecimento histórico.
- c) Tempo para realização de um "user story point".
- d) Tempo de atravessamento ("lead time").

Aula 6: Questões 91 a 105

Questões 91 a 95

91. Versões de produtos e suas datas previstas de lançamento podem ser vistas no:

- a) "Product backlog".
- b) "Release backlog".
- c) "Product roadmap".
- d) "Release burndown".

91. Versões de produtos e suas datas previstas de lançamento podem ser vistas no:

- a) "Product backlog".
- b) "Release backlog".
- c) "Product roadmap".**
- d) "Release burndown".

92. Dois membros de uma equipe começaram um conflito devido às diferenças de opiniões sobre aspectos técnicos muito relevantes para o projeto.

Qual é a melhor primeira atitude a adotar por parte da administração diante deste quadro?

- a) Afastar um dos membros que estão em conflito.
- b) Inserir um(a) expert na equipe que domine o aspecto técnico em questão.
- c) Impor uma solução, mesmo que provisória, para não impactar o projeto.
- d) Deixar a equipe tentar resolver o conflito.

92. Dois membros de uma equipe começaram um conflito devido às diferenças de opiniões sobre aspectos técnicos muito relevantes para o projeto.

Qual é a melhor primeira atitude a adotar por parte da administração diante deste quadro?

- a) Afastar um dos membros que estão em conflito.
- b) Inserir um(a) expert na equipe que domine o aspecto técnico em questão.
- c) Impor uma solução, mesmo que provisória, para não impactar o projeto.
- d) Deixar a equipe tentar resolver o conflito.**

93. Em um conjunto de cartas de “planning poker” elaboradas de acordo com a Sequência de Fibonacci, a carta que estaria imediatamente acima da de valor "21" tem qual valor?

- a) 34
- b) 29
- c) 42
- d) 22

93. Em um conjunto de cartas de “planning poker” elaboradas de acordo com a Sequência de Fibonacci, a carta que estaria imediatamente acima da de valor "21" tem qual valor?

a) 34

b) 29

c) 42

d) 22

Sequência de Fibonacci:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

$$13 + 21 = 34$$

94. Em um grande projeto ou programa que foi dividido em 8 equipes Scrum, qual é a melhor linha de ação para geração de valor e estabelecimento de um bom alicerce?

- a) Explorar ao máximo o paralelismo, cujo risco é atenuado na abordagem, para trazer valor cedo ao usuário na forma da maior quantidade possível de software concluído.
- b) Estabelecer uma gestão de programa que acompanhe de perto as equipes.
- c) Perseguir a composição logo de uma aplicação mínima que reúna os principais elementos da arquitetura da solução.
- d) Reunir a equipe em um único time Scrum, preferencialmente no mesmo espaço físico, para facilitar a comunicação e a colaboração.

94. Em um grande projeto ou programa que foi dividido em 8 equipes Scrum, qual é a melhor linha de ação para geração de valor e estabelecimento de um bom alicerce?

- a) Explorar ao máximo o paralelismo, cujo risco é atenuado na abordagem, para trazer valor cedo ao usuário na forma da maior quantidade possível de software concluído.
- b) Estabelecer uma gestão de programa que acompanhe de perto as equipes.
- c) Perseguir a composição logo de uma aplicação mínima que reúna os principais elementos da arquitetura da solução.**
- d) Reunir a equipe em um único time Scrum, preferencialmente no mesmo espaço físico, para facilitar a comunicação e a colaboração.

95. Ao final de um projeto bem sucedido, qual é a melhor ação a tomar segundo a doutrina ágil?

- a) Reunir os números do projeto e entregar ao Escritório de Projetos, para contribuição à base histórica.
- b) Celebrar.
- c) Iniciar outro projeto imediatamente.
- d) Presentear os melhores membros da equipe.

95. Ao final de um projeto bem sucedido, qual é a melhor ação a tomar segundo a doutrina ágil?

- a) Reunir os números do projeto e entregar ao Escritório de Projetos, para contribuição à base histórica.
- b) Celebrar.**
- c) Iniciar outro projeto imediatamente.
- d) Presentear os melhores membros da equipe.

Aula 6: Questões 91 a 105

Questões 96 a 100

96. No Scrum, a saída de uma “sprint retrospective” pode ser usada no:

- a) “Sprint planning” seguinte.
- b) “Product backlog”.
- c) “Sprint backlog”.
- d) Projeto seguinte, desde que a mesma equipe participe.

96. No Scrum, a saída de uma “sprint retrospective” pode ser usada no:

- a) **“Sprint planning” seguinte.**
- b) “Product backlog”.
- c) “Sprint backlog”.
- d) Projeto seguinte, desde que a mesma equipe participe.

97. Todos os princípios seguintes fazem parte da abordagem "lean", exceto:

- a) Redução de movimentações desnecessárias.
- b) Redução de comunicações desnecessárias.
- c) Redução de defeitos.
- d) Redução de estoques.

97. Todos os princípios seguintes fazem parte da abordagem "lean", exceto:

- a) Redução de movimentações desnecessárias.
- b) Redução de comunicações desnecessárias.**
- c) Redução de defeitos.
- d) Redução de estoques.

98. Quando as metas de uma iteração, no meio da mesma, perdem completamente o sentido, devido à uma mudança de negócio, qual a melhor ação a tomar?

- a) Cancelar a iteração.
- b) Colocar mais itens na iteração que façam sentido para o negócio.
- c) Replanejar a iteração.
- d) Fazer as devidas manutenções no “sprint backlog”.

98. Quando as metas de uma iteração, no meio da mesma, perdem completamente o sentido, devido à uma mudança de negócio, qual a melhor ação a tomar?

- a) Cancelar a iteração.**
- b) Colocar mais itens na iteração que façam sentido para o negócio.
- c) Replanejar a iteração.
- d) Fazer as devidas manutenções no “sprint backlog”.

99. Em uma negociação difícil, com uma outra parte forte, qual é a melhor postura a adotar?

- a) Adiar ao máximo o término da negociação, para "vencer a outra parte pelo cansaço".
- b) Demonstrar mais força do que realmente se tem.
- c) Insistir em critérios objetivos.
- d) Desistir, pois uma força menor nunca pode vencer uma maior.

99. Em uma negociação difícil, com uma outra parte forte, qual é a melhor postura a adotar?

- a) Adiar ao máximo o término da negociação, para "vencer a outra parte pelo cansaço".
- b) Demonstrar mais força do que realmente se tem.
- c) Insistir em critérios objetivos.**
- d) Desistir, pois uma força menor nunca pode vencer uma maior.

100. Ao final de um “sprint”, Product Owner rejeita algumas implementações e a equipe não consegue entender por quê.

Qual pode ser a causa desta situação?

- a) Ausência de alterações em regras de negócio que justifiquem as rejeições.
- b) “Sprint planning” mal feito.
- c) Problemas técnicos.
- d) “Done definition” mal feita.

100. Ao final de um “sprint”, Product Owner rejeita algumas implementações e a equipe não consegue entender por quê.

Qual pode ser a causa desta situação?

- a) Ausência de alterações em regras de negócio que justifiquem as rejeições.
- b) “Sprint planning” mal feito.
- c) Problemas técnicos.
- d) “Done definition” mal feita.**

Aula 6: Questões 91 a 105

Questões 101 a 105

101. O período de atualização adequado de um gráfico de "release burndown" é:

- a) Ao final de cada dia.
- b) Ao final de cada iteração.
- c) Todos os dias, a qualquer momento.
- d) Ao final de cada projeto.

101. O período de atualização adequado de um gráfico de "release burndown" é:

- a) Ao final de cada dia.
- b) Ao final de cada iteração.**
- c) Todos os dias, a qualquer momento.
- d) Ao final de cada projeto.

102. A "a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito", citada nos corolários do Manifesto Ágil, refere-se a:

- a) Simplicidade.
- b) Redução de retrabalhos.
- c) Velocidade.
- d) Ritmo de trabalho adequado.

102. A "a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito", citada nos corolários do Manifesto Ágil, refere-se a:

- a) Simplicidade.**
- b) Redução de retrabalhos.
- c) Velocidade.
- d) Ritmo de trabalho adequado.

103. Uma equipe ágil percebe que não vai conseguir cumprir a meta de uma iteração. Dos 110 “story points” que estão em trabalho, para 5 deles tudo indica que não haverá tempo.

Qual é a melhor medida que esta equipe pode tomar?

- a) Como o volume de trabalho que está para escapar é pequeno, realizar algumas horas extras para fechar completamente a meta.
- b) Procurar perseguir a meta com trabalho diligente, mas nada fazer se ela não for atingida dentro do horário normal de trabalho.
- c) Abrir um impedimento junto ao gestor, para que ele busque meios de evitar a não entrega.
- d) Adicionar pessoas à equipe para cumprir a meta (que é sagrada) e caso não haja pessoas disponíveis para ajudar, aumentar um pouco a duração da iteração.

103. Uma equipe ágil percebe que não vai conseguir cumprir a meta de uma iteração. Dos 110 “story points” que estão em trabalho, para 5 deles tudo indica que não haverá tempo.

Qual é a melhor medida que esta equipe pode tomar?

- a) Como o volume de trabalho que está para escapar é pequeno, realizar algumas horas extras para fechar completamente a meta.
- b) Procurar perseguir a meta com trabalho diligente, mas nada fazer se ela não for atingida dentro do horário normal de trabalho.**
- c) Abrir um impedimento junto ao gestor, para que ele busque meios de evitar a não entrega.
- d) Adicionar pessoas à equipe para cumprir a meta (que é sagrada) e caso não haja pessoas disponíveis para ajudar, aumentar um pouco a duração da iteração.

104. Lições aprendidas e discussão de melhorias são assuntos que devem ser endereçados em quais tipos de reuniões de métodos ágeis?

- a) Em qualquer reunião, sempre que o assunto surgir.
- b) Em reuniões de término do projeto.
- c) Em sessões de estimativas (com uso de "planning games").
- d) Em reuniões de retrospectiva.

104. Lições aprendidas e discussão de melhorias são assuntos que devem ser endereçados em quais tipos de reuniões de métodos ágeis?

- a) Em qualquer reunião, sempre que o assunto surgir.
- b) Em reuniões de término do projeto.
- c) Em sessões de estimativas (com uso de "planning games").
- d) Em reuniões de retrospectiva.**

105. De que forma os métodos ágeis lidam com mudanças de escopo?

- a) Aceitam como parte natural do processo e até consideram bem-vindas, em nome da maximização do valor para o negócio.
- b) As mudanças de escopo são evitadas, pois a equipe trabalha com horizontes muito curtos de entrega.
- c) Não existe a rigor "escopo" em nenhuma etapa de um projeto ágil, pois trabalha-se na verdade com o conceito de "visão".
- d) As mudanças de escopo são aceitas se forem aprovadas e não interferirem no ROI do projeto.

105. De que forma os métodos ágeis lidam com mudanças de escopo?

- a) **Aceitam como parte natural do processo e até consideram bem-vindas, em nome da maximização do valor para o negócio.**
- b) As mudanças de escopo são evitadas, pois a equipe trabalha com horizontes muito curtos de entrega.
- c) Não existe a rigor "escopo" em nenhuma etapa de um projeto ágil, pois trabalha-se na verdade com o conceito de "visão".
- d) As mudanças de escopo são aceitas se forem aprovadas e não interferirem no ROI do projeto.

Aula 7: Questões 106 a 120

Questões 106 a 110

106. O que mais se relaciona com uma abordagem empírica?

- a) Registrar as lições do passado e tentar repetir o que funcionou.
- b) Seguir um plano o máximo possível.
- c) Trabalhar de forma autogerenciada.
- d) Acertar o rumo em pleno voo.

106. O que mais se relaciona com uma abordagem empírica?

- a) Registrar as lições do passado e tentar repetir o que funcionou.
- b) Seguir um plano o máximo possível.
- c) Trabalhar de forma autogerenciada.
- d) Acertar o rumo em pleno voo.**

107. Os valores do Scrum "visibilidade", "inspeção" e "adaptação" podem ser propiciados, respectivamente, por:

- a) Visão do projeto, "sprint retrospective" e reuniões diárias do Scrum.
- b) Visão do projeto, testes e "sprint retrospective".
- c) Kanban, cerimônias do Scrum e "sprint retrospective".
- d) Quadro do projeto ("task board"), "sprint review" e controle empírico.

107. Os valores do Scrum "visibilidade", "inspeção" e "adaptação" podem ser propiciados, respectivamente, por:

- a) Visão do projeto, "sprint retrospective" e reuniões diárias do Scrum.
- b) Visão do projeto, testes e "sprint retrospective".
- c) Kanban, cerimônias do Scrum e "sprint retrospective".
- d) Quadro do projeto ("task board"), "sprint review" e controle empírico.**

108. Quais são, respectivamente, tamanhos razoáveis de um “sprint” e uma equipe Scrum?

- a) 60 dias e 8 pessoas.
- b) 15 dias e 7 pessoas.
- c) 30 dias e 12 pessoas.
- d) 60 dias e 5 pessoas.

108. Quais são, respectivamente, tamanhos razoáveis de um “sprint” e uma equipe Scrum?

- a) 60 dias e 8 pessoas.
- b) 15 dias e 7 pessoas.**
- c) 30 dias e 12 pessoas.
- d) 60 dias e 5 pessoas.

109. Qual dos seguintes itens não deve constar em um “product backlog”?

- a) "O tempo de resposta de qualquer cálculo do sistema deve ser inferior a 3 segundos".
- b) Descrição de uma transação de estorno contábil.
- c) A visão do projeto.
- d) Um "undone" de algum “sprint”.

109. Qual dos seguintes itens não deve constar em um “product backlog”?

- a) "O tempo de resposta de qualquer cálculo do sistema deve ser inferior a 3 segundos".
- b) Descrição de uma transação de estorno contábil.
- c) A visão do projeto.**
- d) Um "undone" de algum “sprint”.

110. Em um projeto ágil, os usuários detentores de conhecimento sobre as regras de negócio devem, idealmente:

- a) Trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento, nos rituais preconizados pelo método ágil adotado.
- b) Validar toda a documentação de análise de negócios produzida pela equipe de desenvolvimento antes do início da codificação.
- c) Atuar como Scrum Masters.
- d) Participar ativamente nas reuniões diárias e validar diariamente os produtos liberados pela equipe de construção.

110. Em um projeto ágil, os usuários detentores de conhecimento sobre as regras de negócio devem, idealmente:

- a) Trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento, nos rituais preconizados pelo método ágil adotado.**
- b) Validar toda a documentação de análise de negócios produzida pela equipe de desenvolvimento antes do início da codificação.
- c) Atuar como Scrum Masters.
- d) Participar ativamente nas reuniões diárias e validar diariamente os produtos liberados pela equipe de construção.

Aula 7: Questões 106 a 120

Questões 111 a 115

111. Um “sponsor” deseja uma estimativa de prazo e custo no início de um projeto que vai ser gerenciado conforme os princípios ágeis. Nesta situação, assinale o alternativa mais cabível:

- a) Deve ser explicado ao “sponsor” que em um projeto ágil não é possível dar uma ordem de grandeza de prazo e custo do projeto a priori.
- b) Uma estimativa de custo e prazo, bem como o número de iterações necessárias, pode ser dado no “release planning”.
- c) Prazos podem ser dados apenas para processos “timeboxed” e, quanto aos custos, não são itens levados em consideração em um projeto ágil.
- d) Não existe a figura do “sponsor” em um projeto ágil.

111. Um “sponsor” deseja uma estimativa de prazo e custo no início de um projeto que vai ser gerenciado conforme os princípios ágeis. Nesta situação, assinale o alternativa mais cabível:

- a) Deve ser explicado ao “sponsor” que em um projeto ágil não é possível dar uma ordem de grandeza de prazo e custo do projeto a priori.
- b) Uma estimativa de custo e prazo, bem como o número de iterações necessárias, pode ser dado no “release planning”.**
- c) Prazos podem ser dados apenas para processos “timeboxed” e, quanto aos custos, não são itens levados em consideração em um projeto ágil.
- d) Não existe a figura do “sponsor” em um projeto ágil.

112. Os "shared resources teams", propostos por Ken Schwaber em sua obra "Agile Software Development with Scrum" consistem em:

- a) Equipes de arquitetos dedicados à construção de componentes reaproveitáveis de uso geral.
- b) Equipes que podem fornecer recursos com diferentes "skills" (análise, codificação, testes) para os times de desenvolvimento.
- c) Equipes de recursos humanos compartilhados entre diversos projetos, visando integração.
- d) Equipes de programas (conjunto de projetos interligados).

112. Os "shared resources teams", propostos por Ken Schwaber em sua obra "Agile Software Development with Scrum" consistem em:

- a) Equipes de arquitetos dedicados à construção de componentes reaproveitáveis de uso geral.**
- b) Equipes que podem fornecer recursos com diferentes "skills" (análise, codificação, testes) para os times de desenvolvimento.
- c) Equipes de recursos humanos compartilhados entre diversos projetos, visando integração.
- d) Equipes de programas (conjunto de projetos interligados).

113. Um sistema de produção "puxada":

- a) Produz para estoque de segurança, que existe para acomodar deficiências do sistema de produção.
- b) Solicita itens para um estágio somente quando necessário e na quantidade necessária.
- c) Funciona de maneira a maximizar o uso dos recursos, via maximização do WIP ("work in progress").
- d) Maximiza a produtividade imprimindo um caráter de estresse positivo na equipe.

113. Um sistema de produção "puxada":

- a) Produz para estoque de segurança, que existe para acomodar deficiências do sistema de produção.
- b) Solicita itens para um estágio somente quando necessário e na quantidade necessária.**
- c) Funciona de maneira a maximizar o uso dos recursos, via maximização do WIP ("Work In Progress").
- d) Maximiza a produtividade imprimindo um caráter de estresse positivo na equipe.

114. A técnica de “Test Driven Development” (TDD) preconiza que:

- a) Testes devem ser executados antes da codificação.
- b) Uma peça de código deve ser feita para passar em um caso de teste feito a priori, com posterior refatoração.
- c) Casos de teste devem ser feitos no lugar de “user stories” para guiar a codificação.
- d) Uma peça de código não precisa ser testada ao final.

114. A técnica de “Test Driven Development” (TDD) preconiza que:

- a) Testes devem ser executados antes da codificação.
- b) Uma peça de código deve ser feita para passar em um caso de teste feito a priori, com posterior refatoração.**
- c) Casos de teste devem ser feitos no lugar de “user stories” para guiar a codificação.
- d) Uma peça de código não precisa ser testada ao final.

115. Para realizar uma estimativa de esforço difícil, qual a técnica mais adequada?

- a) "Wide Band Delphi".
- b) "Brainstorming".
- c) "Earned Value Analysis".
- d) Uso de base de conhecimento (lições aprendidas em projetos anteriores).

115. Para realizar uma estimativa de esforço difícil, qual a técnica mais adequada?

- a) “Wide Band Delphi”.**
- b) “Brainstorming”.
- c) “Earned Value Analysis”.
- d) Uso de base de conhecimento (lições aprendidas em projetos anteriores).

Aula 7: Questões 106 a 120

Questões 116 a 120

116. O termo "epic" se relaciona à:

- a) Meta de uma iteração.
- b) Visão do projeto.
- c) Relação entre as "user stories".
- d) Uma "user story" macro.

116. O termo "epic" se relaciona à:

- a) Meta de uma iteração.
- b) Visão do projeto.
- c) Relação entre as "user stories".
- d) Uma "user story" macro.**

117. Em uma equipe que segue os conceitos de gestão ágil, qual deve ser o maior comprometimento?

- a) Cumprir o plano do projeto estipulado no início dos trabalhos, visando o atingimento da visão.
- b) Cumprir as metas de cada iteração e manter vivos os valores ágeis.
- c) Cumprir o orçamento, o prazo, a qualidade e o escopo do projeto, conforme consensualmente acordado no planejamento.
- d) Entregar o produto o mais rapidamente possível, para benefício do negócio, sem prejuízos para a qualidade e os custos.

117. Em uma equipe que segue os conceitos de gestão ágil, qual deve ser o maior comprometimento?

- a) Cumprir o plano do projeto estipulado no início dos trabalhos, visando o atingimento da visão.
- b) Cumprir as metas de cada iteração e manter vivos os valores ágeis.**
- c) Cumprir o orçamento, o prazo, a qualidade e o escopo do projeto, conforme consensualmente acordado no planejamento.
- d) Entregar o produto o mais rapidamente possível, para benefício do negócio, sem prejuízos para a qualidade e os custos.

118. Uma queda muito acentuada (com taxa maior que a planejada) em um gráfico de “burndown” de uma iteração pode ter as causas seguintes, exceto:

- a) No planejamento da iteração, a equipe superestimou os esforços necessários.
- b) Foi retirado escopo da iteração.
- c) A velocidade da iteração aumentou.
- d) Os esforços foram subestimados ou houve adição de escopo à iteração.

118. Uma queda muito acentuada (com taxa maior que a planejada) em um gráfico de “burndown” de uma iteração pode ter as causas seguintes, exceto:

- a) No planejamento da iteração, a equipe superestimou os esforços necessários.
- b) Foi retirado escopo da iteração.
- c) A velocidade da iteração aumentou.
- d) Os esforços foram subestimados ou houve adição de escopo à iteração.**

119. Em um sistema de produção Kanban, um item novo entra em um estágio produtivo quando:

- a) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido.
- b) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido e um item acabou de sair do estágio.
- c) Nunca (um item novo só pode entrar em uma próxima iteração).
- d) Uma "change request" for aprovada.

119. Em um sistema de produção Kanban, um item novo entra em um estágio produtivo quando:

- a) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido.**
- b) O limite de WIP ("Work In Progress") do estágio não foi excedido e um item acabou de sair do estágio.
- c) Nunca (um item novo só pode entrar em uma próxima iteração).
- d) Uma "change request" for aprovada.

120. Uma equipe de projeto ágil se depara com um novo recurso tecnológico que ninguém nunca usou antes e sobre o qual não há um conhecimento consolidado. Neste caso, convém lançar mão de:

- a) Um “wireframe”.
- b) Alguma técnica de “spike”.
- c) Uma “user story” mais detalhada.
- d) A adoção de um processo empírico de desenvolvimento.

120. Uma equipe de projeto ágil se depara com um novo recurso tecnológico que ninguém nunca usou antes e sobre o qual não há um conhecimento consolidado. Neste caso, convém lançar mão de:

- a) Um “wireframe”.
- b) Alguma técnica de “spike”.**
- c) Uma “user story” mais detalhada.
- d) A adoção de um processo empírico de desenvolvimento.

Aula 7: Questões 106 a 120

Conclusão

Parabéns!!!



Simulado



Fórum



Avalie e comente
